Corte de la ficha: Marzo de 2026

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

14/01/2021	10	14/01/2031	57	52%
Fecha suscripción	Plazo en años	Fecha de Terminación	Meses para vencimiento	% Tiempo Transcurrido

104	23	81	$3.515.203
Total Proyectos	Proyectos DNP-FRPT	Proyectos Nación territorio	Valor Indicativo (Millones)

$2.365.998	$1.124.872	$24.333
Aporte indicativo nación (Millones)	Aporte indicativo territorio (Millones)	Aporte indicativo otros (Millones)

Presupuesto Indicativo por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión	Valor Indicativo	Aporte Indicativo Nación	Aporte indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
Agricultura y Desarrollo Rural	$138.191	$128.651	$9.540	$0
Ambiente y Desarrollo Sostenible	$114.686	$60.056	$54.630	$0
Comercio, Industria y Turismo	$163.000	$126.500	$36.500	$0
Cultura	$160.458	$0	$160.458	$0
Defensa y Policia	$74.560	$74.560	$0	$0
Deporte y Recreacion	$100.405	$99.604	$801	$0
Educación	$230.339	$56.000	$150.005	$24.333
Inclusión Social y Reconciliación	$66.049	$66.049	$0	$0
Justicia y Del Derecho	$222.786	$222.786	$0	$0
Minas y Energía	$229.890	$139.076	$90.814	$0
Salud y Protección Social	$32.834	$0	$32.834	$0
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	$132.696	$132.696	$0	$0
Transporte	$1.516.011	$1.007.496	$508.515	$0
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	$308.914	$252.524	$56.390	$0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	$24.385	$0	$24.385	$0
Total	**$3.515.203**	**$2.365.998**	**$1.124.872**	**$24.333**

Presupuesto Comprometido por Sectores de Inversión (Millones)

Sector de inversión	Comprometido Total	Comprometido Nación	Comprometido Territorio	Comp. Aporte Otros
Agricultura y Desarrollo Rural	$31.191	$21.651	$9.540	$0

Ambiente y Desarrollo Sostenible	$71.922	$48.932	$22.990	$0
Comercio, Industria y Turismo	$101.764	$101.764	$0	$0
Cultura	$190.194	$0	$190.194	$0
Defensa y Policia	$74.560	$74.560	$0	$0
Deporte y Recreacion	$106.632	$81.273	$25.359	$0
Educación	$225.232	$56.000	$137.229	$32.003
Inclusión Social y Reconciliación	$67.953	$66.049	$1.904	$0
Justicia y Del Derecho	$208.456	$208.456	$0	$0
Minas y Energía	$134.261	$86.017	$48.244	$0
Salud y Protección Social	$32.834	$0	$32.834	$0
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	$107.811	$107.811	$0	$0
Transporte	$1.745.830	$1.129.338	$616.492	$0
Vivienda Ciudad y Territorio - Agua	$166.510	$101.238	$65.272	$0
Vivienda Ciudad y Territorio - Vivienda	$24.385	$0	$24.385	$0
Total	**$3.289.534**	**$2.083.088**	**$1.174.443**	**$32.003**

Entidades Aportantes de Recursos de la Oferta Nación y Otros

Pacto Territorial	Entidad Nación aportante	Entidad Otros aportante	Presupuesto Comprometido Nación	Presupuesto Comprometido Aporte Otros
Pacto Territorial Cesar - La Guajira			$0	$0
	CORPOCESAR		$3.601	$0
	DNP		$19.036	$0
	DNP-FRPT		$798.464	$0
		Universidad Nacional de Colombia (UNAL)	$56.000	$32.003
	INVIAS		$576.433	$0
	MADS		$5.559	$0
	MinAgricultura		$2.615	$0
	MinEnergía		$66.062	$0
	MinTIC		$107.811	$0
	MinVivienda		$101.238	$0
	Policía Nacional de Colombia (PONAL)		$74.560	$0

Pacto Territorial Cesar - La Guajira	Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (UAEAC)		$63.253	$0
	Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC)		$208.456	$0

Compromisos de Recursos por Parte de la Nación y el Territorio

Pacto Territorial	Aporte Indicativo Nación	Presupuesto Comprometido Nación	% Avance Nación
Pacto Territorial Cesar - La Guajira	$2.365.998	$2.083.088	88,04%

Pacto Territorial	Aporte Indicativo Territorio	Presupuesto Comprometido Territorio	% Avance Territorio
Pacto Territorial Cesar - La Guajira	$1.124.872	$1.174.443	104,41%

Avance Consolidado (En Ejecución + Ejecutado) (Millones)

93,58%

$3.289.534

Valor Comprometido = En Ejecución + Ejecutado

Número de Proyectos por Estado

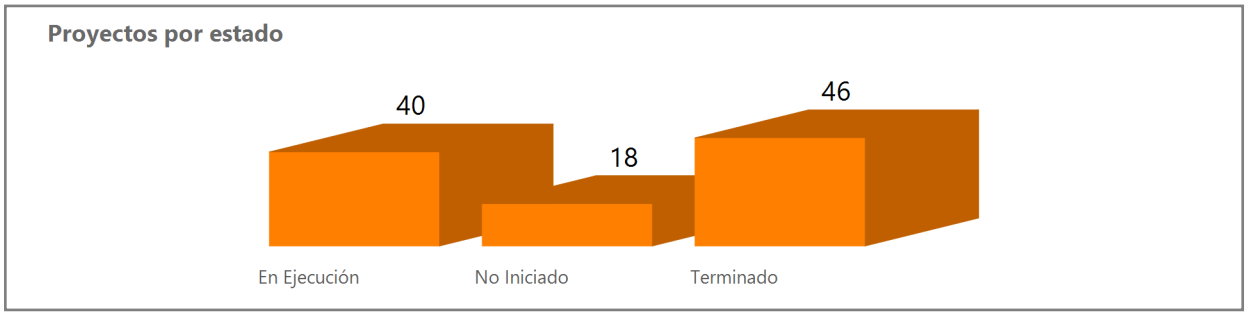

Comparación de Avance por Trimestre (Millones)

Año	Trimestre	Trimestre	Presupuesto Comprometido Total	% Avance Consolidado	Proyectos En Ejecución	Proyectos Terminados
2024	1. Trim. 04	1. Trim. 04 - 2024	$3.295.518	93,75%	48	37
2025	2. Trim. 01	2. Trim. 01 - 2025	$3.303.188	93,97%	45	41
	3. Trim. 02	3. Trim. 02 - 2025	$3.324.900	94,59%	41	44
	4. Trim. 03	4. Trim. 03 - 2025	$3.289.534	93,58%	40	46

2025	5. Trim. 04	5. Trim. 04 - 2025	$3.289.534	93,58%	40	46
2026	6. Trim. 01	6. Trim. 01 - 2026	$3.289.534	93,58%	40	46

Gráfico de Comparación de Avance Consolidado del PEI (Millones)

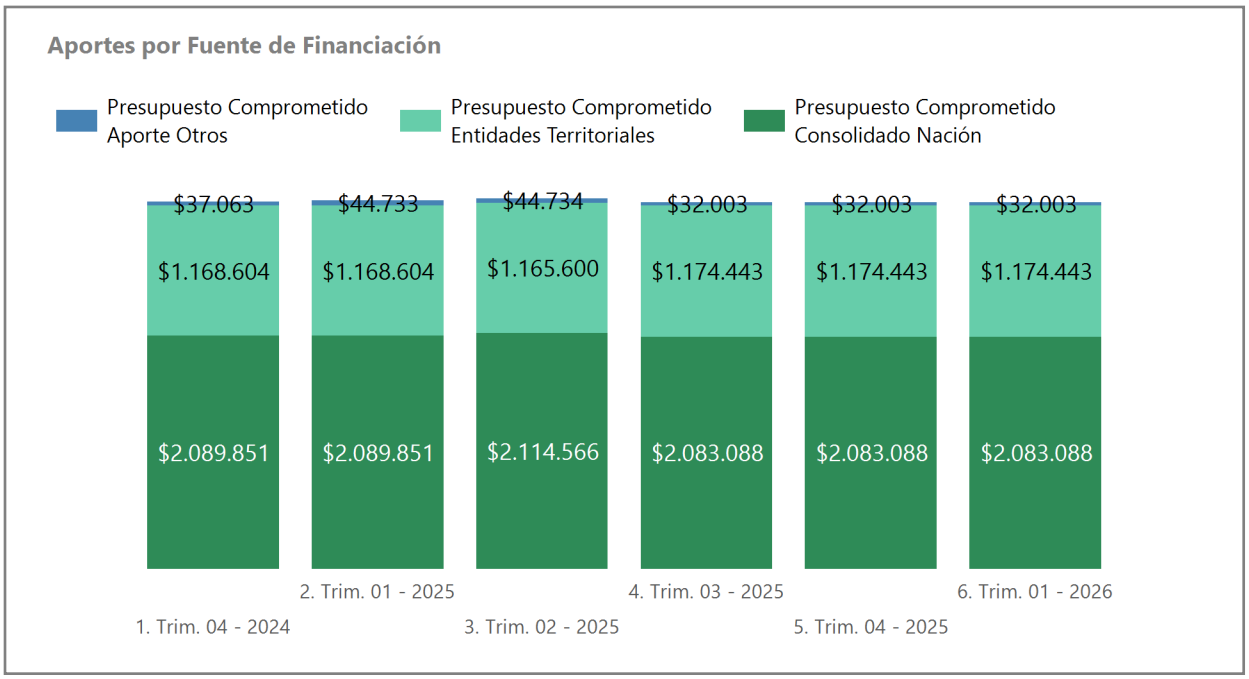

Iniciativas del Plan Estratégico de Inversiones (PEI) (Millones)

Estado Proyecto	Nombre Proyecto	Inversión Total	Aporte Indicativo Nación	Aportes indicativo Territorio	Aporte indicativo Otros
En Ejecución	Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, zona sur, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento de Cesar (Grupo II)	$302.328	$189.804	$112.524	$0
En Ejecución	Conexión Alta Guajira (Uribia- Puerto Bolívar-Estrella; vías wayuu)	$284.974	$284.974	$0	$0
En Ejecución	Mejoramiento de vías secundarias y terciarias en el Departamento de Cesar (Grupo I)	$195.642	$144.867	$50.775	$0
En Ejecución	Cárcel de Riohacha	$184.786	$184.786	$0	$0

En Ejecución	Construcción Centro de eventos históricos y cultural de la Música Vallenata, en el municipio de Valledupar, Departamento del Cesar	$146.458	$0	$146.458	$0
En Ejecución	Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, Grupo 3, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento de Cesar (Grupo III)	$94.684	$87.847	$6.837	$0
En Ejecución	Tramo Florida - Cuestecitas	$75.000	$0	$75.000	$0
En Ejecución	Policía Metropolitana de Valledupar	$74.560	$74.560	$0	$0
En Ejecución	Proyecto solar Uribia	$72.121	$72.121	$0	$0
En Ejecución	Construcción Adecuación y Mejoramiento del urbanismo sobre el malecón, Distrito de Riohacha, departamento de La Guajira	$70.000	$70.000	$0	$0
En Ejecución	Conectividad y transformación digital Departamento de Cesar	$69.487	$69.487	$0	$0
En Ejecución	Conectividad y transformación digital departamento de La Guajira	$63.209	$63.209	$0	$0
En Ejecución	Construcción Plaza de Ventas - Galería de vendedores ambulantes Valledupar	$50.000	$50.000	$0	$0
En Ejecución	Construcción del alcantarillado pluvial de la calle 7a, entre la carrera 19 (Avenida Simón Bolívar) y la carrera 4 y entre la carrera 4 y el Río Guatapurí; correspondiente a la primera fase del colector pluvial no 2, en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar	$45.720	$45.720	$0	$0
En Ejecución	Instalación de sistemas de autogeneración eléctrica con tecnología solar fotovoltaica en viviendas rurales no interconectadas del municipio de Dibulla, La Guajira	$32.928	$0	$32.928	$0

En Ejecución	Atención extramural	$32.834	$0	$32.834	$0
En Ejecución	Construcción de una Marina Multipropósito en Riohacha, Distrito Especial Turístico y Cultural, La Guajira	$32.000	$32.000	$0	$0
En Ejecución	Mejoramiento vial de la ruta folclorica mediante la construccion de pavimento en asfalto entre el Municipio de Villanueva y la zona agricola de Veracruz, Municipio de San Juan del Cesar - Departamento de La Guajira	$28.885	$28.885	$0	$0
En Ejecución	Mejoramiento De La Red Vial Terciaria G3, En Los Municipios De Maicao, Riohacha, Dibulla Y Uribia en el Departamento de La Guajira.	$28.562	$28.562	$0	$0
En Ejecución	Mejoramiento Aeropuerto Hacaritama	$28.000	$21.000	$7.000	$0
En Ejecución	Construcción de villa deportiva en el municipio de Urumita, departamento de La Guajira	$24.859	$24.859	$0	$0
En Ejecución	Mejoramiento urbanístico y obras complementarias en los municipios de hatonuevo y el molino departamento de La Guajira	$24.385	$0	$24.385	$0
En Ejecución	Mejoramiento de la vía que comunica las veredas San Antonio la Y sector el Venao, Manaure BC	$19.846	$0	$19.846	$0
En Ejecución	Estudios y Diseños Embalse Multipropósito los Besotes	$19.036	$19.036	$0	$0
En Ejecución	Mejoramiento de la vía terciaria la Y de casa blanca en el corregimiento de Llerasca - Iroka, en el núcleo llerasca del municipio de Agustín Codazzi	$18.298	$0	$18.298	$0

En Ejecución	Ejecución de estudios, diseños construcción y apuesta en funcionamiento del proyecto de abastecimiento de agua mediante el esquema de pilas publicas, en el sector de La Guajira zona industrial-municipio de Uribia	$16.339	$11.283	$5.057	$0
En Ejecución	Etapa II De La Construcción de pavimento en asfalto de la ruta folclórica entre el municipio de Villanueva – La Guajira y la zona agrícola del corregimiento de Badillo - municipio de Valledupar.	$15.225	$15.225	$0	$0
En Ejecución	Energía convencional Cabo	$14.000	$7.000	$7.000	$0
En Ejecución	Mejoramiento de vías terciarias mediante el uso de placa huella, de la vía que conduce desde el Corregimiento de Conejo hasta la Ye de las Colonias, en el Municipio de Fonseca, La Guajira	$12.797	$0	$12.797	$0
En Ejecución	Desarrollo de acciones de emprendimiento y fortalecimiento microempresarial como estrategia de reactivación económica para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad en los municipios de La Paz, Pueblo Bello, San Diego, Manaure, Cesar	$12.012	$12.012	$0	$0
En Ejecución	Optimización del sistema de acueducto del Corregimiento de Patillal, Municipio de Valledupar	$10.496	$0	$10.496	$0
En Ejecución	Mejoramiento De La Red Vial Terciaria G1, en Los Municipios De Urumita, La Jagua Del Pilar, El Molino, Villanueva y San Juan Del Cesar, en el Departamento de La Guajira	$10.210	$10.210	$0	$0

En Ejecución	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de sichichon, municipio de Manaure, La Guajira	$5.543	$3.827	$1.715	$0
En Ejecución	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de puerto estrella municipio de Uribia	$5.336	$3.499	$1.837	$0
En Ejecución	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de punta espada municipio de Uribia	$5.227	$5.227	$0	$0
En Ejecución	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de tratamiento osmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de riritana, municipio de Maicao, La Guajira	$4.669	$4.669	$0	$0
En Ejecución	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de la gloria, municipio de Manaure, La Guajira	$4.552	$3.143	$1.409	$0

En Ejecución	Construcción del sistema alcantarillado sanitario de los barrios Villa Azul y Villa del Cesar en el municipio de El Copey	$3.498	$2.116	$1.383	$0
En Ejecución	Construcción y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de San Sebastián, municipio de Curumaní, Departamento del del Cesar.	$2.559	$1.517	$1.041	$0
En Ejecución	Construcción de puente vehicular sobre el paso crítico k9+294 vía Villanueva – Veracruz Municipio de Villanueva, Departamento de La Guajira	$2.000	$2.000	$0	$0
No Iniciado	Distrito de Riego San Juan	$107.000	$107.000	$0	$0
No Iniciado	Ampliación PTAR sobre río Cesar. Valledupar	$100.000	$100.000	$0	$0
No Iniciado	Erosión Costera Dibulla	$41.729	$0	$41.729	$0
No Iniciado	Energía Solar del Sur	$40.000	$40.000	$0	$0
No Iniciado	Segunda Torre del Palacio de Justicia de Valledupar	$38.000	$38.000	$0	$0
No Iniciado	Centro de Energía Renovables	$30.000	$0	$30.000	$0
No Iniciado	Construcción de alcantarillado y canal para el drenaje pluvial en diferentes sectores del distrito de Riohacha	$28.251	$18.363	$9.888	$0
No Iniciado	Pavimentación del tramo la y Mayusa - duda alta, en zona rural del municipio de Agustín Codazzi	$23.027	$0	$23.027	$0
No Iniciado	Amoblamiento de Espolones	$18.000	$18.000	$0	$0
No Iniciado	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de la junta, la peña y curazao, en el municipio de san juan (departamento de La Guajira)	$15.152	$10.152	$5.000	$0
No Iniciado	Mercados de Maicao	$15.000	$0	$15.000	$0
No Iniciado	Mercados de Riohacha	$15.000	$0	$15.000	$0

No Iniciado	Archivo departamental	$14.000	$0	$14.000	$0
No Iniciado	Muelles de Cabotaje (4 municipios sin Riohacha, Dibulla, Manaure y dos en Uribia)	$13.000	$6.500	$6.500	$0
No Iniciado	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de El Molino-departamento de La Guajira	$6.260	$6.260	$0	$0
No Iniciado	Optimización hidráulica acueducto Hatonuevo	$4.822	$2.893	$1.929	$0
No Iniciado	Mejoramiento de la vía terciaria el corregimiento de Media Luna a Tocaimo en el municipio de San Diego	$2.664	$2.664	$0	$0
No Iniciado	Construcción De Pavimento En Concreto Rígido De Las Calles Y Carreras Del Municipio De Pueblo Bello - Cesar	$2.030	$2.030	$0	$0
Terminado	Infraestructura educativa	$150.005	$0	$150.005	$0
Terminado	Mejoramiento a través de la construcción, gestión predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada Valledupar-Puente Rafael Escalona-La Paz y el mantenimiento y rehabilitación de la carretera La Paz-Cuestecitas, en los departamentos del Cesar y La Guajira	$108.013	$108.013	$0	$0
Terminado	Construcción de la etapa I del edificio de aulas laboratorios y zona de bienestar fase II - Universidad Nacional de Colombia sede de La Paz – Cesar	$80.333	$56.000	$0	$24.333
Terminado	Mejoramiento, Gestión Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Carretera Cuatro vientos Codazzi en el Departamento de Cesar, en marco del Programa de Obras Publica "Concluir y Concluir para la Reactivación de las Regiones. Modulo 2.	$53.185	$53.185	$0	$0

Terminado	Mejoramiento de la vía que conduce desde el casco urbano del municipio de Pueblo Bello hasta los corregimientos de Costa Rica y Colon, Del Municipio de Pueblo Bello	$43.212	$0	$43.212	$0
Terminado	Mejoramiento de la vía que comunica el corregimiento de Sitio Nuevo con el Municipio de Fonseca, en el departamento de La Guajira	$33.353	$0	$33.353	$0
Terminado	Mejoramiento de la vía San Jacinto - siete de agosto en el municipio de Agustín Codazzi	$33.241	$0	$33.241	$0
Terminado	Construcción de obras como estrategia de mitigación y control de inundaciones en la cabecera municipal de La Gloria, departamento del Cesar	$30.407	$30.407	$0	$0
Terminado	Mejoramiento tramo vía la ye de Canadá - manantial sector rural del municipio de Becerril	$24.501	$0	$24.501	$0
Terminado	Construcción y estructuración integral de soluciones individuales fotovoltaicas en vivienda rural dispersa de municipios ubicados sobre la línea colectora de energía, departamento de La Guajira	$19.955	$19.955	$0	$0
Terminado	Juegos Bolivarianos - Coliseo Multifuncional Oscar Muñoz Oviedo.	$18.331	$18.331	$0	$0
Terminado	Construcción De Patinódromo En El Municipio De La Jagua De Ibirico, Departamento Del Cesar	$18.219	$18.219	$0	$0
Terminado	Mejoramiento de la vía que comunica las veredas nuevas flores y arroyo de agua, San Diego	$15.541	$0	$15.541	$0

Terminado	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Carretera El Carmen - Valledupar - Maicao. Transversal Carmen - Bosconia - Valledupar - Maicao. Bolívar, Magdalena, Cesar, La Guajira	$13.885	$13.885	$0	$0
Terminado	Construcción y optimización sistema de conducción y redes de distribución del sistema de acueducto de la cabecera urbana de Agustín Codazzi etapa 1 - Departamento del del Cesar	$13.707	$8.129	$5.578	$0
Terminado	Implementación de sistemas autónomos de generación de energía solar fotovoltaica para la energización de la segunda etapa de viviendas en las zonas rurales no interconectadas del municipio de Agustín Codazzi	$13.079	$0	$13.079	$0
Terminado	Implementación de estrategias para la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático en la zona rural de diferentes municipios del Departamento de Cesar	$12.900	$0	$12.900	
Terminado	Construcción De Estadio Municipal Edison Mejia En El Municipio De La Paz, Departamento Del Cesar	$12.694	$12.000	$694	$0
Terminado	Mejoramiento de la red vial terciaria G2, en los municipios de Barrancas - Fonseca, Distracción, Hatonuevo y Albania, en el departamento de La Guajira.	$11.226	$11.226	$0	$0
Terminado	Construcción de las redes de alcantarillado sanitario, estaciones de bombeo y sistema de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de Saloa, municipio de Chimichagua, Cesar	$11.211	$7.738	$3.473	$0

Terminado	Construcción de Escenarios Deportivos en la Unidad Recreacional del Municipio de Chimichagua, Departamento del Cesar	$10.995	$10.995	$0	$0
Terminado	Optimización del sistema de acueducto y alcantarillado (Fase 2) de la cabecera municipal de Astrea, Departamento del del Cesar	$10.211	$6.055	$4.155	$0
Terminado	Mejoramiento de la vía que comunica Azufral con la vereda Remolinos en el municipio de Becerril	$9.848	$0	$9.848	$0
Terminado	Construcción de escenarios deportivos en el municipio de El Paso, departamento del Cesar	$9.600	$9.600	$0	$0
Terminado	Mejoramiento vial en concreto rígido de la vía principal de Almapoque a la vereda Mamonal del municipio de Fonseca - La Guajira	$9.570	$0	$9.570	$0
Terminado	Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector cacaotero del Municipio de San Diego	$9.540	$0	$9.540	$0
Terminado	Construcción de las obras para mitigar el riesgo de inundación en el sector de la vía de acceso a la cabecera municipal de La Gloria – Cesar	$9.365	$9.365	$0	$0
Terminado	Implementación de sistemas de generación de energía solar fotovoltaica autónomos, para la energización de viviendas rurales en zonas no interconectadas del municipio de Valledupar	$7.807	$0	$7.807	$0
Terminado	Mejoramiento de la vía con la construcción de placa huella en tramos críticos de la vereda de san salvador, corregimiento de Palomino, municipio de Dibulla, La Guajira	$6.855	$0	$6.855	$0

Terminado	Mejoramiento de la interconexión vial de las veredas Hondo del Rio - El Venao - San Antonio con el municipio de Manaure	$6.290	$0	$6.290	$0
Terminado	Construcción del parque recreacional- cancha de futbol - Obra de urbanismo y biosaludables del Barrio Yovanny Soto ubicado en el Municipio de Pueblo Bello, Departamento del Cesar.	$5.707	$5.600	$107	$0
Terminado	Construcción de obras en el punto de producción, sistema de ósmosis inversa, construcción pilas aferentes, suministro de dotación para pilas, componente social y aseguramiento en la comunidad de flor de La Guajira, municipio de Uribia, La Guajira	$5.105	$5.105	$0	$0
Terminado	Construcción y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de San Bernardo en el municipio de Pelaya, Departamento del del Cesar	$4.659	$2.763	$1.896	$0
Terminado	Construcción de obras para el control de inundación y erosión en los arroyos Kutanamana y Chemerrain en el municipio de Uribia departamento de La Guajira	$4.397	$4.397	$0	$0
Terminado	Construcción del Centro de Desarrollo Infantil CDI en el barrio Villa Taxi en el municipio de Valledupar	$4.036	$4.036	$0	$0
Terminado	Desarrollo de acciones para la protección y recuperación de la biodiversidad del ecosistema de la Serranía del Perijá en el municipio de Codazzi, Cesar	$3.846	$3.846	$0	$0

Terminado	Optimización hidráulica del sistema de tratamiento de agua potable, y micromedición del casco urbano del municipio de La Gloria en el Departamento del del Cesar.	$3.764	$2.232	$1.532	$0
Terminado	Construcción de canal abierto en concreto rígido para evitar las inundaciones en el sector nororiental del casco urbano de San Juan del Cesar - La Guajira	$3.323	$3.323	$0	$0
Terminado	Recuperación hidrodinámica y ambiental del caño Paraluz como estrategia de recuperación de la ciénaga mata de palma, en el municipio de El Paso y Chiriguaná, Cesar	$3.310	$3.310	$0	$0
Terminado	Actualización Estudios y Diseños Distrito de Riego San Juan y Ranchería	$2.615	$2.615	$0	$0
Terminado	Formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca 2802-03 del río Chiriaimo y Manaure en el Departamento de Cesar	$2.165	$2.165	$0	$0
Terminado	Estudios y diseños mejoramiento pavimentación carretera Cuatro Vientos Codazzi Dto. Cesar	$2.035	$2.035	$0	$0
Terminado	Restauración de áreas degradadas en las microcuencas del río Magiriaimo, jurisdicción de CorpoCesar	$1.862	$1.862	$0	$0
Terminado	Construcción de 121 unidades sanitarias con saneamiento básico para vivienda rural dispersa del municipio de Gamarra	$1.834	$1.834	$0	$0
Terminado	Implementación de acciones de adaptación al cambio climático en el edificio bioclimático y el CAVFFS, sedes de CorpoCesar en el marco del PIGCCT del Departamento de Cesar	$1.381	$1.381	$0	$0

Terminado	Estudios y diseños fase 3 para la construcción de terminales, torre de control, base SEI y obras complementarias del aeropuerto Hacaritama de Aguachica, Cesar	$1.086	$1.086	$0	$0
Total		**$3.515.203**	**$2.365.998**	**$1.124.872**	**$24.333**

Proyectos Fondo Regional para los Pactos Territoriales (Millones)

23 **Total Proyectos**	$1.050.059 **Valor Indicativo (Millones)**

$854.789 **Aporte indicativo DNP FRPT**	$170.937 **Aporte indicativo territorio**	$0 **Aporte indicativo Sector**	$24.333 **Aporte indicativo Otros**

23 **Proyectos En Ejecución /Ejecutado**	$1.189.386 **Presupuesto Comprometido (Millones)**

Nombre proyecto	Estado proyecto	Valor Indicativo	Aporte indicativo DNP FRPT	Aportes indicativo Territorio	Aportes indicativo Sector	Aporte indicativo Otros
Construcción Plaza de Ventas - Galería de vendedores ambulantes Valledupar	En Ejecución	$50.000	$50.000	$0	$0	$0
Construcción de una Marina Multipropósito en Riohacha, Distrito Especial Turístico y Cultural, La Guajira	En Ejecución	$32.000	$32.000	$0	$0	$0
Construcción Adecuación y Mejoramiento del urbanismo sobre el malecón, Distrito de Riohacha, departamento de La Guajira	En Ejecución	$70.000	$70.000	$0	$0	$0
Construcción de villa deportiva en el municipio de Urumita, departamento de La Guajira	En Ejecución	$24.859	$24.859	$0	$0	$0

Desarrollo de acciones de emprendimiento y fortalecimiento microempresarial como estrategia de reactivación económica para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad en los municipios de La Paz, Pueblo Bello, San Diego, Manaure, Cesar	En Ejecución	$12.012	$12.012	$0	$0	$0
Mejoramiento de vías secundarias y terciarias en el Departamento de Cesar (Grupo I)	En Ejecución	$195.642	$144.867	$50.775	$0	$0
Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, Grupo 3, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento de Cesar (Grupo III)	En Ejecución	$94.684	$87.847	$6.837	$0	$0
Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, zona sur, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento de Cesar (Grupo II)	En Ejecución	$302.328	$189.804	$112.524	$0	$0
Mejoramiento De La Red Vial Terciaria G1, en Los Municipios De Urumita, La Jagua Del Pilar, El Molino, Villanueva y San Juan Del Cesar, en el Departamento de La Guajira	En Ejecución	$10.210	$10.210	$0	$0	$0
Mejoramiento De La Red Vial Terciaria G3, En Los Municipios De Maicao, Riohacha, Dibulla Y Uribia en el Departamento de La Guajira.	En Ejecución	$28.562	$28.562	$0	$0	$0

Construcción de puente vehicular sobre el paso crítico k9+294 vía Villanueva – Veracruz Municipio de Villanueva, Departamento de La Guajira	En Ejecución	$2.000	$2.000	$0	$0	$0
Etapa II De La Construcción de pavimento en asfalto de la ruta folclórica entre el municipio de Villanueva – La Guajira y la zona agrícola del corregimiento de Badillo - municipio de Valledupar.	En Ejecución	$15.225	$15.225	$0	$0	$0
Construcción de la etapa I del edificio de aulas laboratorios y zona de bienestar fase II - Universidad Nacional de Colombia sede de La Paz – Cesar	Terminado	$80.333	$56.000	$0	$0	$24.333
Construcción de escenarios deportivos en el municipio de El Paso, departamento del Cesar	Terminado	$9.600	$9.600	$0	$0	$0
Construcción de Escenarios Deportivos en la Unidad Recreacional del Municipio de Chimichagua, Departamento del Cesar	Terminado	$10.995	$10.995	$0	$0	$0
Construcción del Centro de Desarrollo Infantil CDI en el barrio Villa Taxi en el municipio de Valledupar	Terminado	$4.036	$4.036	$0	$0	$0
Construcción De Estadio Municipal Edison Mejia En El Municipio De La Paz, Departamento Del Cesar	Terminado	$12.694	$12.000	$694	$0	$0

Construcción del parque recreacional-cancha de futbol - Obra de urbanismo y biosaludables del Barrio Yovanny Soto ubicado en el Municipio de Pueblo Bello, Departamento del Cesar.	Terminado	$5.707	$5.600	$107	$0	$0
Construcción y estructuración integral de soluciones individuales fotovoltaicas en vivienda rural dispersa de municipios ubicados sobre la línea colectora de energía, departamento de La Guajira	Terminado	$19.955	$19.955	$0	$0	$0
Construcción De Patinódromo En El Municipio De La Jagua De Ibirico, Departamento Del Cesar	Terminado	$18.219	$18.219	$0	$0	$0
Construcción de obras como estrategia de mitigación y control de inundaciones en la cabecera municipal de La Gloria, departamento del Cesar	Terminado	$30.407	$30.407	$0	$0	$0
Construcción de las obras para mitigar el riesgo de inundación en el sector de la vía de acceso a la cabecera municipal de La Gloria – Cesar	Terminado	$9.365	$9.365	$0	$0	$0
Mejoramiento de la red vial terciaria G2, en los municipios de Barrancas - Fonseca, Distracción, Hatonuevo y Albania, en el departamento de La Guajira.	Terminado	$11.226	$11.226	$0	$0	$0
Total		**$1.050.059**	**$854.789**	**$170.937**	**$0**	**$24.333**

Notas Aclaratorias

Nota aclaratoria DNP-FRPT: Los proyectos financiados o cofinanciados con recursos del DNP–FRPT se reportan en estado "En ejecución" por la suscripción del contrato específico con la entidad territorial ejecutora. No obstante, la ejecución física del proyecto depende de la contratación derivada que adelante dicha entidad.

Si desea conocer mayor información de los pactos territoriales lo invitamos a seguir este enlace

https://pactosterritoriales.dnp.gov.co/Pactos-Territoriales-suscritos/Paginas/Pacto-Territorial-Cesar-La-Guajira.aspx

ANEXO

DNP- Fondo Regional para los Pactos Territoriales* Proyectos en ejecución y ejecutados

* Fichas elaboradas con base en la información reportada por el sistema de información SECONEF, en el marco del contrato interadministrativo de mandato nro. 877 de 2021, suscrito entre el DNP y ENTerritorio S.A.

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte
27/03/2026

Construcción del parque recreacional- cancha de futbol - Obra de urbanismo y biosaludables del Barrio Yovanny Soto ubicado en el Municipio de Pueblo Bello, Departamento del Cesar.

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

$5.707	Liquidado
Valor Indicativo del Proyecto (millones)	Estado Detallado

$5.600	$0	$107	$0
Aporte DNP FRPT (millones)	Aporte Nación - Sector (millones)	Aporte Territorio (millones)	Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Deporte y Recreacion	**Municipio Intervención**	PUEBLO BELLO
BPIN	2021205700033	**Área de influencia**	Urbano
No. Contrato Específico	069-2210652	**Es Inversión climática?**	No
No. CONPES Anexo B	59	**Tiene viabilidad?**	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	**Fecha viabilidad**	27/05/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto	
Construcción parque recreacional con área a intervenir de 12.857m2 que consta de una cancha de futbol de 6.174 m2, con grama natural y graderías con capacidad para 363 personas aproximadamente, gimnasio biosaludable, juegos de niños, andenes de circulaciones peatonal, zonas verdes, parqueaderos, infraestructura para servicios complementarios como: Baterías sanitarias, oficina administrativa, camerinos, cuarto técnico o de bombas, cuarto eléctrico y deposito.	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	1	Número de personas

Información específica de ejecución contrato específico

13/10/2021	5/01/2022	19	5/08/2023	1.459
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios

$5.600	$0	$107	$0
Pto Comprometido DNP FRPT	Pto Comprometido Sector	Pto Comprometido Territorio	Pto Comprometido Otros

$5.707
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

5/08/2023	100%	100%
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

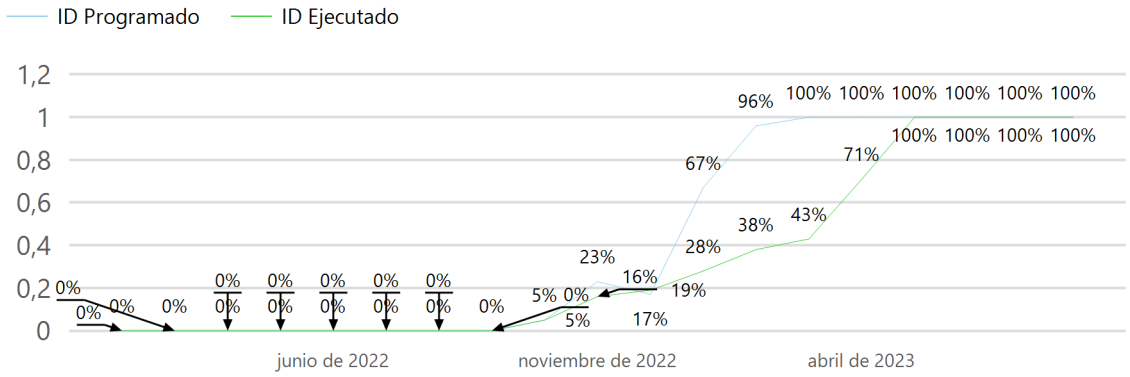

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026 Fecha de Corte Avance	
$5.600 Valor Programado (mill)	100% % Programado
$5.568 Valor Ejecutado (mill)	99% % Ejecutado

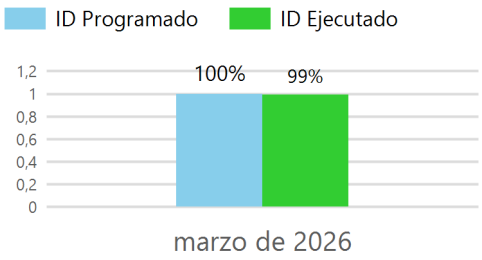

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte
27/03/2026

Mejoramiento de vías secundarias y terciarias en el Departamento de Cesar (Grupo I)

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

$195.642	En ejecución de obra
Valor Indicativo del Proyecto (millones)	Estado Detallado

$144.867	$0	$50.775	$0
Aporte DNP FRPT (millones)	Aporte Nación - Sector (millones)	Aporte Territorio (millones)	Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	**Municipio Intervención**	Departamento de Cesar
BPIN	2021002200118	**Área de influencia**	Rural
No. Contrato Específico	070-2210657	**Es Inversión climática?**	No
No. CONPES Anexo B	98	**Tiene viabilidad?**	Si
Sesión CD inclusión PEI	6	**Fecha viabilidad**	11/05/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Mejorar las condiciones de rodadura en ocho (8) vías terciarias de siete (7) municipios de la zona norte y centro del departamento, equivalentes a 88.49 km intervenidos	Vía terciaria mejorada	88,49 Kilometros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

13/10/2021	1/04/2022	49	2/05/2026	329.245
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios

$144.867	$0	$71.158	$0
Pto Comprometido DNP FRPT	Pto Comprometido Sector	Pto Comprometido Territorio	Pto Comprometido Otros

$216.025
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

1/04/2026	100%	100%
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

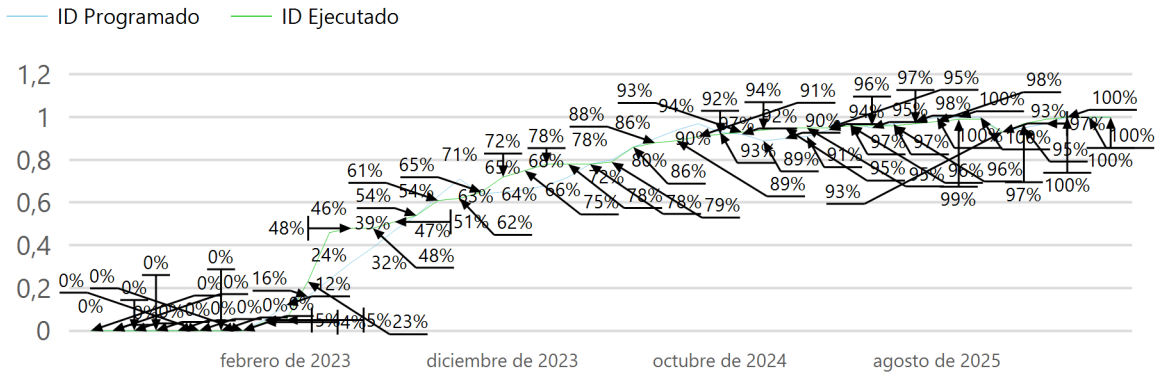

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026

Fecha de Corte Avance

$144.867

Valor Programado (mill)

100%

% Programado

$130.380

Valor Ejecutado (mill)

90%

% Ejecutado

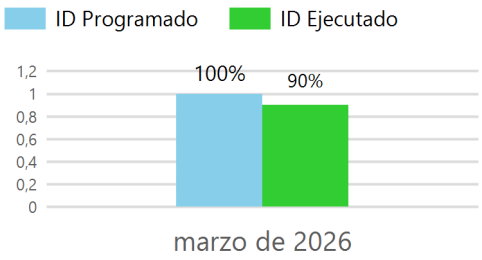

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte
27/03/2026

Construcción De Estadio Municipal Edison Mejia En El Municipio De La Paz, Departamento Del Cesar

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

$12.694 Valor Indicativo del Proyecto (millones)	Ejecutado Estado Detallado

$12.000 Aporte DNP FRPT (millones)	$0 Aporte Nación - Sector (millones)	$694 Aporte Territorio (millones)	$0 Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Deporte y Recreacion	**Municipio Intervención**	La Paz
BPIN	2021206210028	**Área de influencia**	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	075-2210678	**Es Inversión climática?**	No
No. CONPES Anexo B	61	**Tiene viabilidad?**	Si
Sesión CD inclusión PEI	3	**Fecha viabilidad**	16/07/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de un estadio de futbol con la intervención de áreas libres 26.580,52 metros cuadrados, áreas cubiertas 889.97 metros cuadrados y tribunas con un aforo para 1.170 personas aproximadamente, para beneficiar a 21.391 personas.	Cancha construida	1 Número de canchas

Información específica de ejecución contrato específico

21/10/2021 Fecha de Suscripción	6/05/2022 Fecha de Inicio	29 Plazo en Meses	6/10/2024 Fecha Terminación	29.603 Número de Beneficiarios

$12.000 Pto Comprometido DNP FRPT	$0 Pto Comprometido Sector	$4.358 Pto Comprometido Territorio	$0 Pto Comprometido Otros

$16.358
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

6/12/2024 Fecha de Corte Avance	100% % Programado	100% % Ejecutado

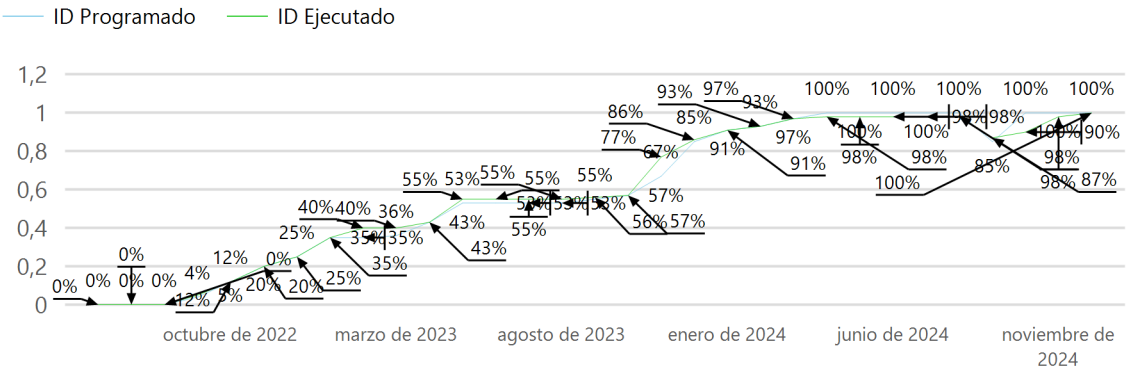

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026 Fecha de Corte Avance	
$12.000 Valor Programado (mill)	100% % Programado
$11.997 Valor Ejecutado (mill)	100% % Ejecutado

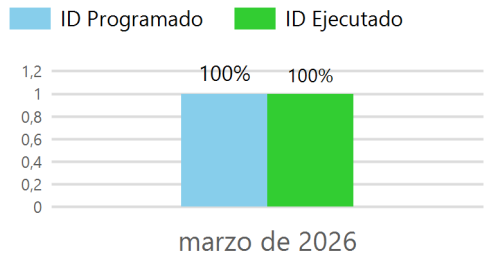

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte
27/03/2026

Construcción de Escenarios Deportivos en la Unidad Recreacional del Municipio de Chimichagua, Departamento del Cesar

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

$10.995	En Liquidación
Valor Indicativo del Proyecto (millones)	Estado Detallado

$10.995	$0	$0	$0
Aporte DNP FRPT (millones)	Aporte Nación - Sector (millones)	Aporte Territorio (millones)	Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Deporte y Recreacion	**Municipio Intervención**	Chimichagua
BPIN	2021201750026	**Área de influencia**	Urbano
No. Contrato Específico	078-2210702	**Es Inversión climática?**	No
No. CONPES Anexo B	60	**Tiene viabilidad?**	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	**Fecha viabilidad**	20/10/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de escenarios deportivos en 25.797,68 m2 que consta de cancha de futbol en grama sintética, pista de patinaje de velocidad ruta con sus respectivas graderías, áreas de integración de los escenarios deportivos, juegos infantiles y gimnasio biosaludable al aire libre, parqueadero	Parque recreo-deportivo construido y dotado	1 Número de parques recreo-deportivos

Información específica de ejecución contrato específico

2/11/2021	26/11/2021	33	31/08/2024	14.530
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios

$10.995	$0	$0	$0
Pto Comprometido DNP FRPT	Pto Comprometido Sector	Pto Comprometido Territorio	Pto Comprometido Otros

$10.995
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

26/09/2024	100%	100%
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

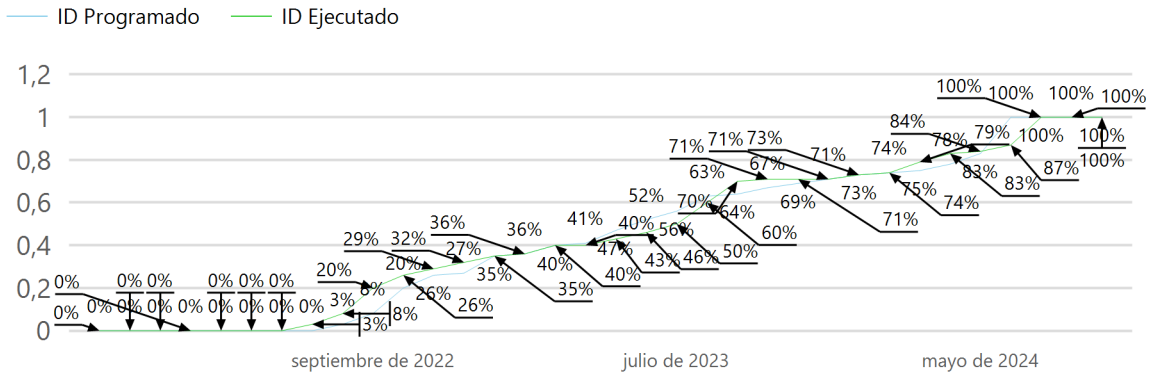

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026

Fecha de Corte Avance

$10.995

Valor Programado (mill)

100%

% Programado

$10.921

Valor Ejecutado (mill)

99%

% Ejecutado

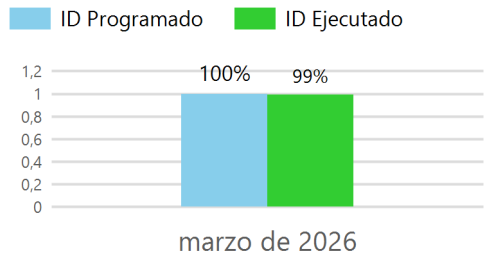

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte
27/03/2026

Construcción de escenarios deportivos en el municipio de El Paso, departamento del Cesar

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

$9.600	En Liquidación
Valor Indicativo del Proyecto (millones)	Estado Detallado

$9.600	$0	$0	$0
Aporte DNP FRPT (millones)	Aporte Nación - Sector (millones)	Aporte Territorio (millones)	Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Deporte y Recreacion	**Municipio Intervención**	El Paso
BPIN	2021202500031	**Área de influencia**	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	082-2210723	**Es Inversión climática?**	No
No. CONPES Anexo B	62	**Tiene viabilidad?**	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	**Fecha viabilidad**	27/09/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de un escenario deportivo el cual consta de un (1) patinódromo y gradería, una (1) cancha de fútbol y gradería, instalaciones eléctricas e iluminación zonas exteriores – andenes, juego de niños, gimnasio bio-saludable, zonas verdes, cerramiento exterior, para beneficiar a 5.379 habitantes.	Parque recreo-deportivos construidos	1 Número de parques recreo-deportivos

Información específica de ejecución contrato específico

9/11/2021	29/12/2021	34	15/10/2024	7.422
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios

$9.600	$0	$32	$0
Pto Comprometido DNP FRPT	Pto Comprometido Sector	Pto Comprometido Territorio	Pto Comprometido Otros

$9.632
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

29/09/2024	100%	100%
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

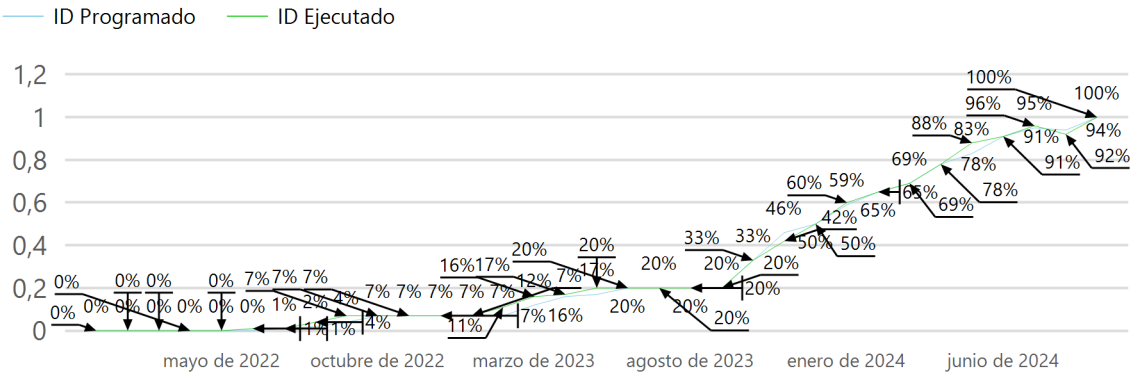

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026 Fecha de Corte Avance	
$9.600 Valor Programado (mill)	100% % Programado
$9.599 Valor Ejecutado (mill)	100% % Ejecutado

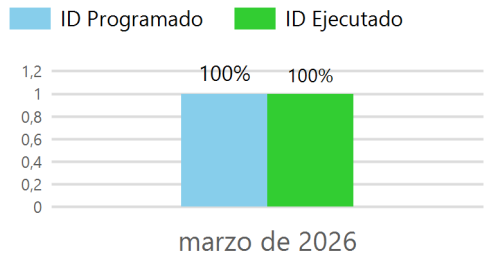

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte
27/03/2026

Construcción y estructuración integral de soluciones individuales fotovoltaicas en vivienda rural dispersa de municipios ubicados sobre la línea colectora de energía, departamento de La Guajira

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

$19.955	Liquidado
Valor Indicativo del Proyecto (millones)	Estado Detallado

$19.955	$0	$0	$0
Aporte DNP FRPT (millones)	Aporte Nación - Sector (millones)	Aporte Territorio (millones)	Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Minas y Energía	**Municipio Intervención**	Uribia(La Guajira), Riohacha(La Guajira), Maicao(La Guajira), Manaure (La Guajira)
BPIN	2020002440062	**Área de influencia**	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	093-2210739	**Es Inversión climática?**	Si
No. CONPES Anexo B	87	**Tiene viabilidad?**	Si
Sesión CD inclusión PEI	2	**Fecha viabilidad**	06/08/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto	
Suministro instalación y puesta en funcionamiento de 1.122 soluciones de energía solar fotovoltaica en los municipios de Manaure, Maicao, Riohacha y Uribia, para beneficiar a 4.488 habitantes.	Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas	1122	unidades

Información específica de ejecución contrato específico

11/11/2021	3/01/2022	19	3/08/2023	4.488
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios

$19.955	$0	$0	$0
Pto Comprometido DNP FRPT	Pto Comprometido Sector	Pto Comprometido Territorio	Pto Comprometido Otros

$19.955
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

3/08/2023	100%	100%
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

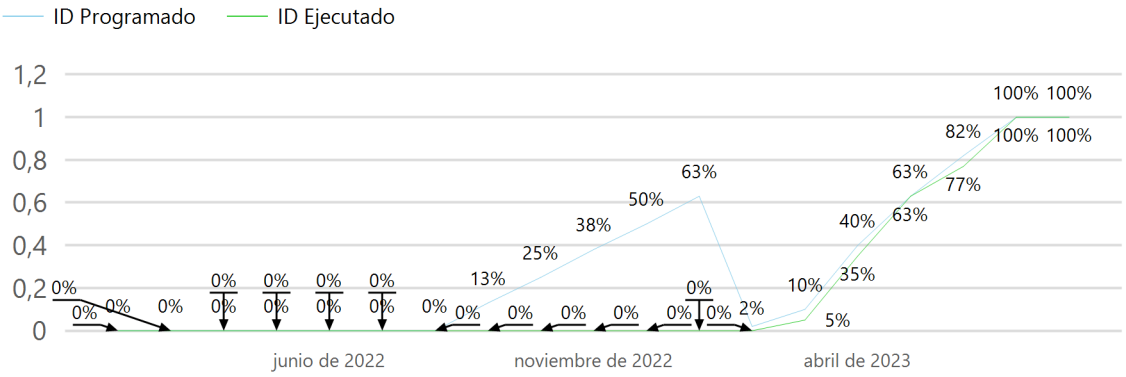

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026 Fecha de Corte Avance	
$19.955 Valor Programado (mill)	100% % Programado
$19.954 Valor Ejecutado (mill)	100% % Ejecutado

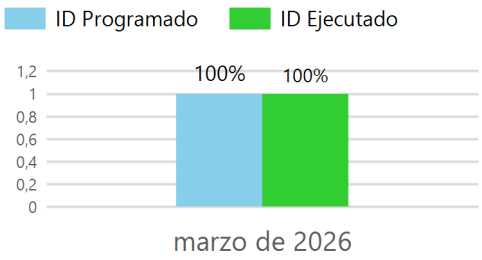

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte
27/03/2026

Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, zona sur, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento de Cesar (Grupo II)

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

$302.328 Valor Indicativo del Proyecto (millones)	En ejecución de obra Estado Detallado

$189.804 Aporte DNP FRPT (millones)	$0 Aporte Nación - Sector (millones)	$112.524 Aporte Territorio (millones)	$0 Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	**Municipio Intervención**	Departamento de Cesar
BPIN	2021002200129	**Área de influencia**	Rural
No. Contrato Específico	094-2210740	**Es Inversión climática?**	No
No. CONPES Anexo B	99	**Tiene viabilidad?**	Si
Sesión CD inclusión PEI	6	**Fecha viabilidad**	11/05/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Mejorar seis corredores viales con una longitud total de 127.74	Vía terciaria mejorada	127,74 Kílometros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

11/11/2021 Fecha de Suscripción	1/04/2022 Fecha de Inicio	49 Plazo en Meses	1/05/2026 Fecha Terminación	329.245 Número de Beneficiarios

$189.804 Pto Comprometido DNP FRPT	$0 Pto Comprometido Sector	$208.936 Pto Comprometido Territorio	$0 Pto Comprometido Otros

$398.740
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

1/03/2026 Fecha de Corte Avance	100% % Programado	93% % Ejecutado

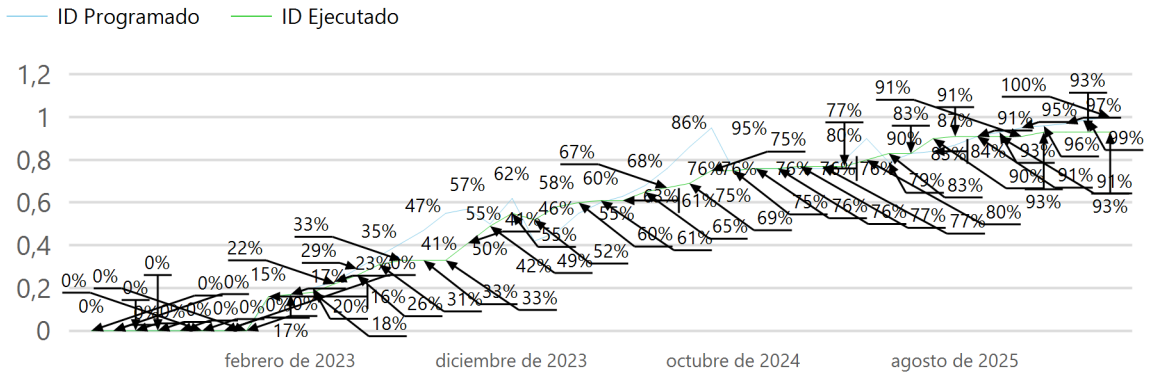

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026 Fecha de Corte Avance	
$189.804 Valor Programado (mill)	100% % Programado
$170.824 Valor Ejecutado (mill)	90% % Ejecutado

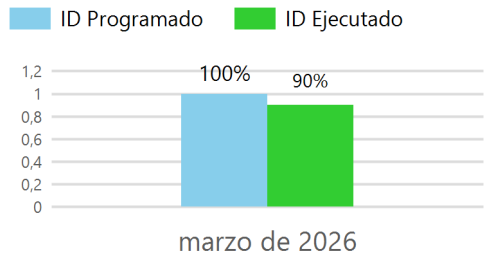

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte
27/03/2026

Construcción de la etapa I del edificio de aulas laboratorios y zona de bienestar fase II - Universidad Nacional de Colombia sede de La Paz – Cesar

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

$80.333	Ejecutado
Valor Indicativo del Proyecto (millones)	Estado Detallado

$56.000	$0	$0	$24.333
Aporte DNP FRPT (millones)	Aporte Nación - Sector (millones)	Aporte Territorio (millones)	Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Educación	**Municipio Intervención**	La Paz
BPIN	2021206210067	**Área de influencia**	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	105-2210716	**Es Inversión climática?**	No
No. CONPES Anexo B	75	**Tiene viabilidad?**	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	**Fecha viabilidad**	12/10/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de la etapa I del edificio de aulas laboratorios y zona de bienestar fase II - Universidad Nacional de Colombia sede de La Paz", se ejecutará un (1) bloque de aulas laboratorio para imagen y sonido, un (1) bloque de aulas laboratorio para visualización, análisis de datos y GIScience, un (1) bloque de aulas laboratorio para inteligencia artificial y percepción remota; la construcción de estos bloques incluye la generación de los siguientes espacios: 30 salas de estudio, 1 restaurante con capacidad para 240 personas, 1 cocina, 6 puntos fijos con cuartos técnicos y zonas de servicio y Áreas comunes y zonas de circulación, para beneficiar a 1.112 habitantes.	Sedes de instituciones de educación superior o terciariamejoradas (Producto principal del proyecto)	1 unidades

Información específica de ejecución contrato específico

2/12/2021	4/02/2022	36	19/02/2025	1.053.000
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios

$56.000	$0	$0	$32.003
Pto Comprometido DNP FRPT	Pto Comprometido Sector	Pto Comprometido Territorio	Pto Comprometido Otros

$88.003

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

4/02/2025	100%	100%
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

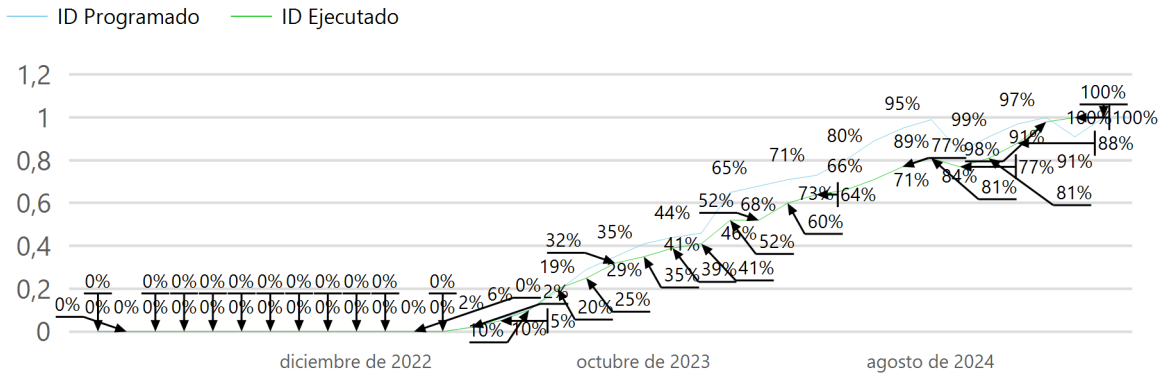

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026
Fecha de Corte Avance

$56.000	100%
Valor Programado (mill)	% Programado
$50.400	90%
Valor Ejecutado (mill)	% Ejecutado

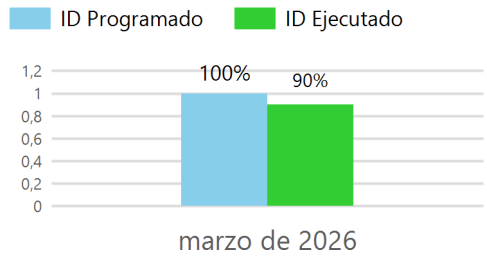

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte
27/03/2026

Construcción de villa deportiva en el municipio de Urumita, departamento de La Guajira

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

$24.859	Suspendido
Valor Indicativo del Proyecto (millones)	Estado Detallado

$24.859	$0	$0	$0
Aporte DNP FRPT (millones)	Aporte Nación - Sector (millones)	Aporte Territorio (millones)	Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Deporte y Recreacion	**Municipio Intervención**	Urumita
BPIN	2021448550077	**Área de influencia**	Urbano
No. Contrato Específico	119-2220696	**Es Inversión climática?**	No
No. CONPES Anexo B	72	**Tiene viabilidad?**	Si
Sesión CD inclusión PEI	3	**Fecha viabilidad**	11/11/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construir los espacios deportivos que constan de: Construcción de 1 pista del patinaje, 1 cancha de futbol, 1 pista de atletismo, 1 cancha multifuncional para básquet, voleibol, cancha futbol sala y 1 cancha futbol cinco; senderos de caminata, plazas de reunión, jardines arborizados y áreas comerciales para la autosostenibilidad. Área a intervenir aproximada de 52.483,26 m2	Parques recreativos construidos y dotados	1 Número de parques

Información específica de ejecución contrato específico

18/07/2022	12/08/2022	39	28/11/2025	6.887
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios

$24.859	$0	$0	$0
Pto Comprometido DNP FRPT	Pto Comprometido Sector	Pto Comprometido Territorio	Pto Comprometido Otros

$24.859
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

12/12/2025	100%	100%
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

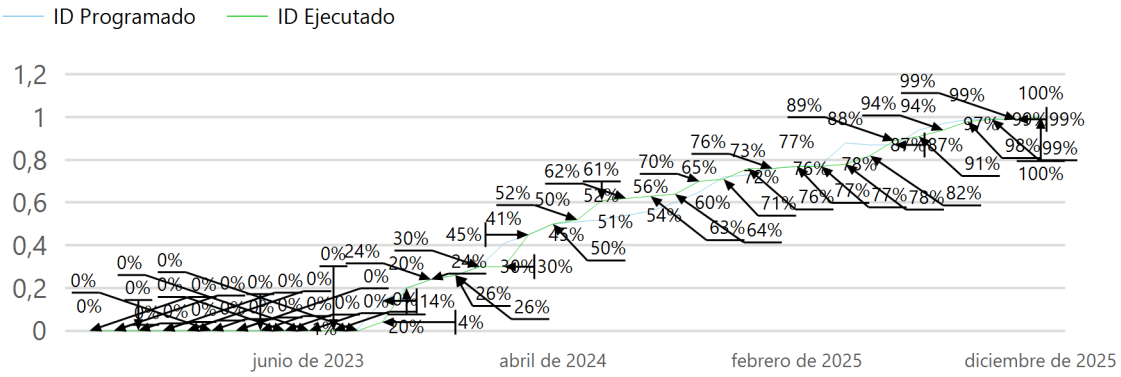

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026 Fecha de Corte Avance	
$24.859 Valor Programado (mill)	100% % Programado
$22.373 Valor Ejecutado (mill)	90% % Ejecutado

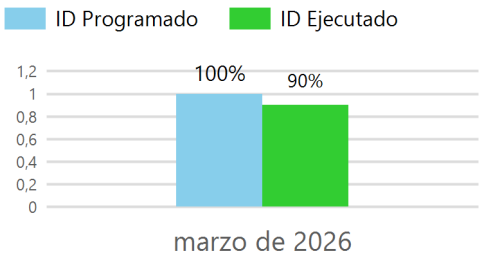

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte
27/03/2026

Construcción De Patinódromo En El Municipio De La Jagua De Ibirico, Departamento Del Cesar

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

$18.219	En Liquidación
Valor Indicativo del Proyecto (millones)	Estado Detallado

$18.219	$0	$0	$0
Aporte DNP FRPT (millones)	Aporte Nación - Sector (millones)	Aporte Territorio (millones)	Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Deporte y Recreacion	**Municipio Intervención**	La Jagua de Ibirico
BPIN	2022204000035	**Área de influencia**	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	131-2220889	**Es Inversión climática?**	No
No. CONPES Anexo B	63	**Tiene viabilidad?**	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	**Fecha viabilidad**	29/06/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de un Patinódromo Profesional y cancha de futbol 5 con área deportiva, área de servicios y área recreativa, para beneficiar a 329.245 habitantes	Pistas construidas (Producto principal del proyecto	1
		unidades

Información específica de ejecución contrato específico

17/08/2022	2/12/2022	22	2/10/2024	50.946
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios

$18.219	$0	$0	$0
Pto Comprometido DNP FRPT	Pto Comprometido Sector	Pto Comprometido Territorio	Pto Comprometido Otros

$18.219
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

2/10/2024	100%	100%
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

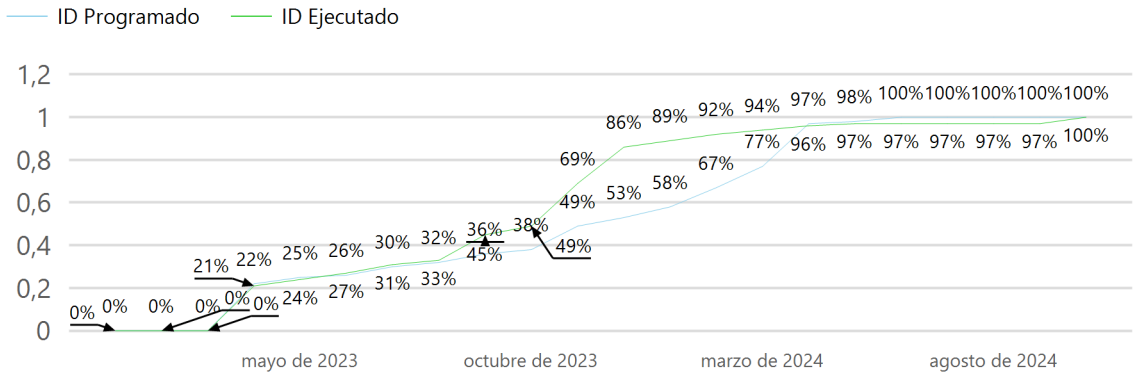

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026 Fecha de Corte Avance	
$18.219 Valor Programado (mill)	100% % Programado
$17.574 Valor Ejecutado (mill)	96% % Ejecutado

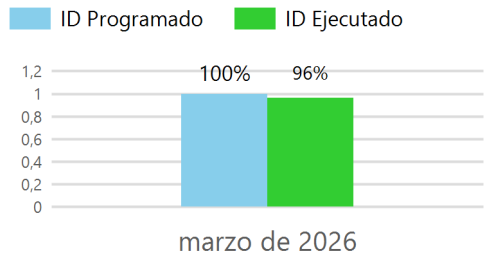

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte
27/03/2026

Mejoramiento De La Red Vial Terciaria G1, en Los Municipios De Urumita, La Jagua Del Pilar, El Molino, Villanueva y San Juan Del Cesar, en el Departamento de La Guajira

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

$10.210	En ejecución de obra
Valor Indicativo del Proyecto (millones)	Estado Detallado

$10.210	$0	$0	$0
Aporte DNP FRPT (millones)	Aporte Nación - Sector (millones)	Aporte Territorio (millones)	Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	**Municipio Intervención**	Departamento de La Guajira
BPIN	2022448550050	**Área de influencia**	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	132-2220890	**Es Inversión climática?**	No
No. CONPES Anexo B	94	**Tiene viabilidad?**	Si
Sesión CD inclusión PEI	6	**Fecha viabilidad**	10/03/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
El proyecto consiste en la construcción de 6.67 km de tramos viales en los municipios de Urumita, La Jagua Del Pilar, El Molino, Villanueva Y San Juan Del Cesar, en el departamento de La Guajira específicamente en: URUMITA: 1 K6+254.12 K6+383.39 129.270 2 K6+603.79 K6+863.34 259.550 3 K7+655.92 K8+832.91 1176.990 TOTAL 1565.810 LA JAGUA DEL PILAR: 1 K0+000.00 K1+236.28 1236.280 TOTAL 1236.280 EL MOLINO: 1 K0+000.00 K1+284.39 1284.390 TOTAL 1284.390 VILLANUEVA: 1 K0+000.00 K1+560.09 1560.090 TOTAL 1560.090 SAN JUAN DEL CESAR: 1 K0+000.00 K1+025.30 1025.300 TOTAL 1025.300 El proyecto en cuestión incluye las siguientes actividades: *CONTROL Y MEDICIÓN PERMANENTE (COMISIÓN DE TOPOGRÁFICA). *ESTRUCTURAS DE DRENAJE. *PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO. *PLACA HUELLA	Vía terciaria mejorada	6,67 Kilómetros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

17/08/2022	10/10/2022	42	1/04/2026	101.180

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios

$10.210	$0	$0	$0
Pto Comprometido DNP FRPT	Pto Comprometido Sector	Pto Comprometido Territorio	Pto Comprometido Otros

$10.210

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

10/05/2025	100%	23%
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

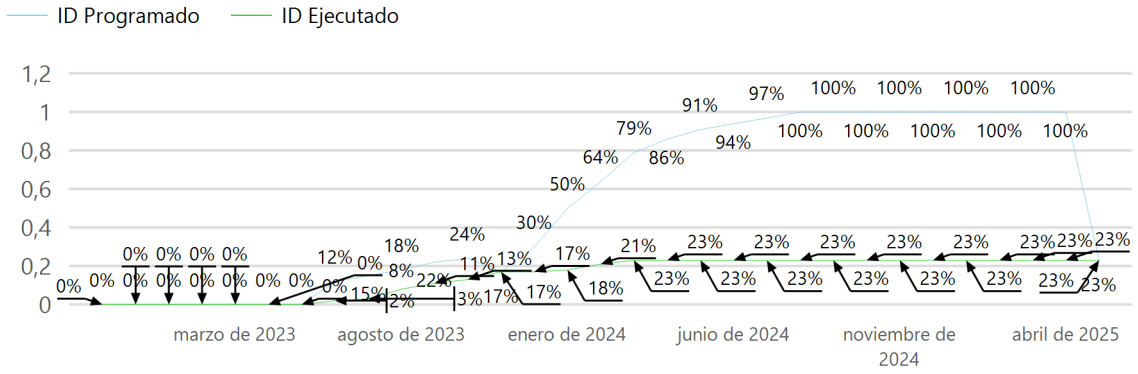

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026
Fecha de Corte Avance

$10.210	100%
Valor Programado (mill)	% Programado
$5.594	55%
Valor Ejecutado (mill)	% Ejecutado

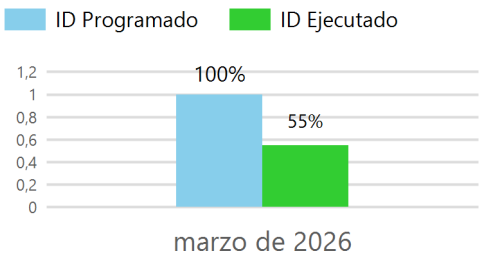

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte
27/03/2026

Etapa II De La Construcción de pavimento en asfalto de la ruta folclórica entre el municipio de Villanueva – La Guajira y la zona agrícola del corregimiento de Badillo - municipio de Valledupar.

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

$15.225	Suspendido
Valor Indicativo del Proyecto (millones)	Estado Detallado

$15.225	$0	$0	$0
Aporte DNP FRPT (millones)	Aporte Nación - Sector (millones)	Aporte Territorio (millones)	Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	**Municipio Intervención**	Villanueva
BPIN	2022448740020	**Área de influencia**	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	134-2220940	**Es Inversión climática?**	No
No. CONPES Anexo B	147	**Tiene viabilidad?**	Si
Sesión CD inclusión PEI	6	**Fecha viabilidad**	28/07/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de 5,730 kilómetros de pavimento en Asfalto en el tramo Veracruz - corregimiento de San Juan del Cesar y Badillo - corregimiento de Valledupar. Para ello se ejecutaran las siguientes actividades: 1- EXPLANACIONES Y PRELIMINARES. 2- ESTRUCTURA DE BOX CUOVERT 1,5X1,5 3- ESTRUCTURA DE BOX CUOVERT 1X1 4- CANAL SEMICIRCULAR 5- ESTRUCTURA DE BOX CUOVERT DOBLE DE 2X3 6- PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO 7- OBRAS DE PROTECCIÓN 8- SEÑALIZACIÓN	Vía terciaria mejorada	5,73 Kilómetros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

19/08/2022	31/10/2022	50	31/12/2026	29.704
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios

$15.221	$0	$0	$0
Pto Comprometido DNP FRPT	Pto Comprometido Sector	Pto Comprometido Territorio	Pto Comprometido Otros

$15.221
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

31/10/2024	100%	5%
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

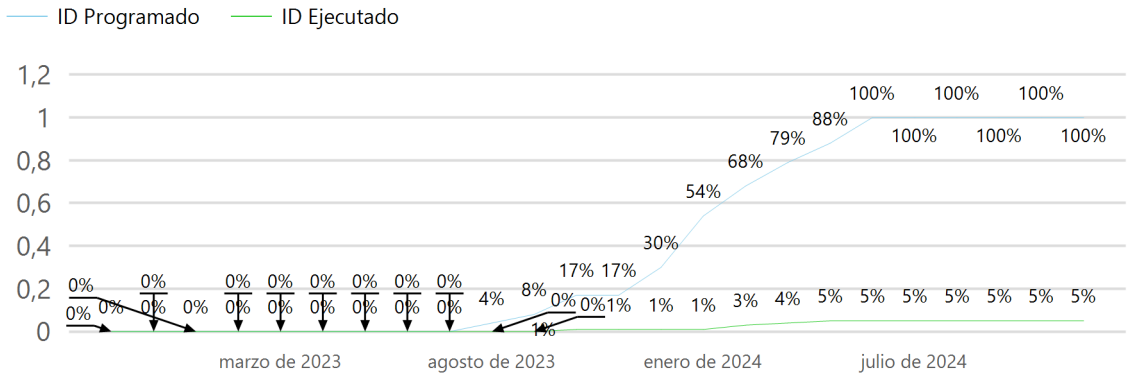

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026	$15.221	74%
Fecha de Corte Avance	Valor Programado (mill)	% Programado
	$3.045	15%
	Valor Ejecutado (mill)	% Ejecutado

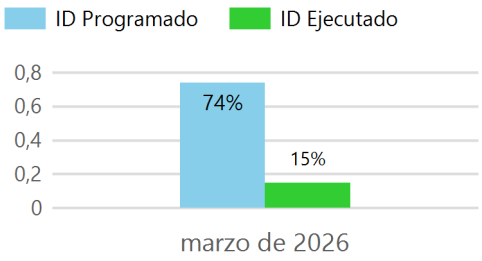

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte
27/03/2026

Construcción del Centro de Desarrollo Infantil CDI en el barrio Villa Taxi en el municipio de Valledupar

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

$4.036	Ejecutado
Valor Indicativo del Proyecto (millones)	Estado Detallado

$4.036	$0	$0	$0
Aporte DNP FRPT (millones)	Aporte Nación - Sector (millones)	Aporte Territorio (millones)	Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Inclusión Social y Reconciliación	**Municipio Intervención**	Valledupar
BPIN	2021200010085	**Área de influencia**	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	135-2220939	**Es Inversión climática?**	No
No. CONPES Anexo B	82	**Tiene viabilidad?**	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	**Fecha viabilidad**	27/09/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de un centro de desarrollo infantil CDI en el barrio Villa Taxi en el municipio de Valledupar, que albergará 250 niños entre 0 y 5 años en los estratos 0, 1 y 2 de la comuna 4 y que beneficiará a 3.000 habitantes.	Centros regionales de atención a víctimas restaurados (Producto principal del proyecto	1 Número de centros

Información específica de ejecución contrato específico

22/08/2022	4/11/2022	27	4/02/2025	3.000
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios

$4.036	$0	$1.871	$0
Pto Comprometido DNP FRPT	Pto Comprometido Sector	Pto Comprometido Territorio	Pto Comprometido Otros

$5.907
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

4/12/2024	100%	100%
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

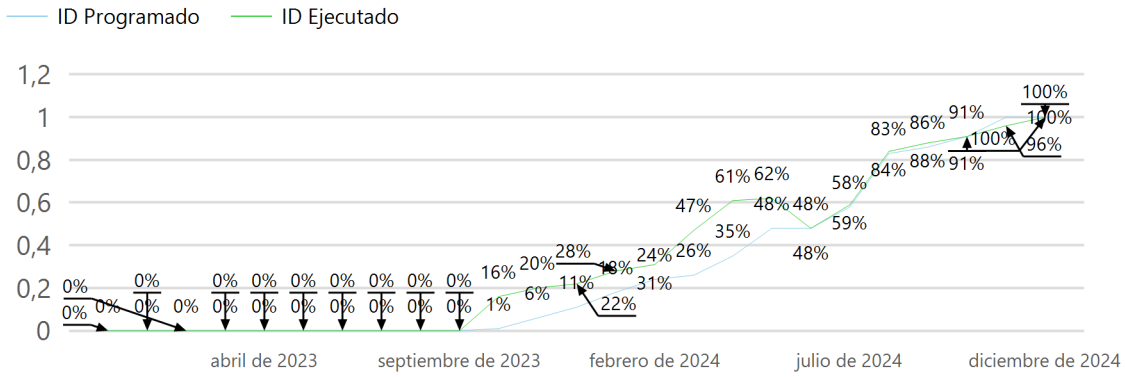

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026 Fecha de Corte Avance	
$4.036 Valor Programado (mill)	100% % Programado
$3.633 Valor Ejecutado (mill)	90% % Ejecutado

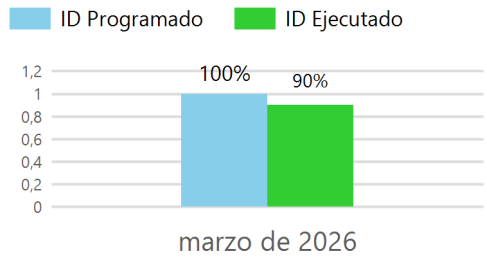

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte
27/03/2026

Construcción de las obras para mitigar el riesgo de inundación en el sector de la vía de acceso a la cabecera municipal de La Gloria – Cesar

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

$9.365 Valor Indicativo del Proyecto (millones)	En Liquidación Estado Detallado

$9.365 Aporte DNP FRPT (millones)	$0 Aporte Nación - Sector (millones)	$0 Aporte Territorio (millones)	$0 Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	**Municipio Intervención**	La Gloria
BPIN	2021203830069	**Área de influencia**	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	139-2221129	**Es Inversión climática?**	Si
No. CONPES Anexo B	39	**Tiene viabilidad?**	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	**Fecha viabilidad**	18/02/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto	
Fortalecer el talud y proteger contra el riesgo de inundación, contemplando la construcción de 430 metros lineales de estructura en concreto de 4000 PSI para proteger contra inundación.	Obras para la prevención y control de inundaciones	430	Metros lineales de estructura

Información específica de ejecución contrato específico

24/10/2022 Fecha de Suscripción	9/12/2022 Fecha de Inicio	17 Plazo en Meses	30/05/2024 Fecha Terminación	15.543 Número de Beneficiarios

$9.365 Pto Comprometido DNP FRPT	$0 Pto Comprometido Sector	$0 Pto Comprometido Territorio	$0 Pto Comprometido Otros

$9.365
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

9/05/2024 Fecha de Corte Avance	100% % Programado	100% % Ejecutado

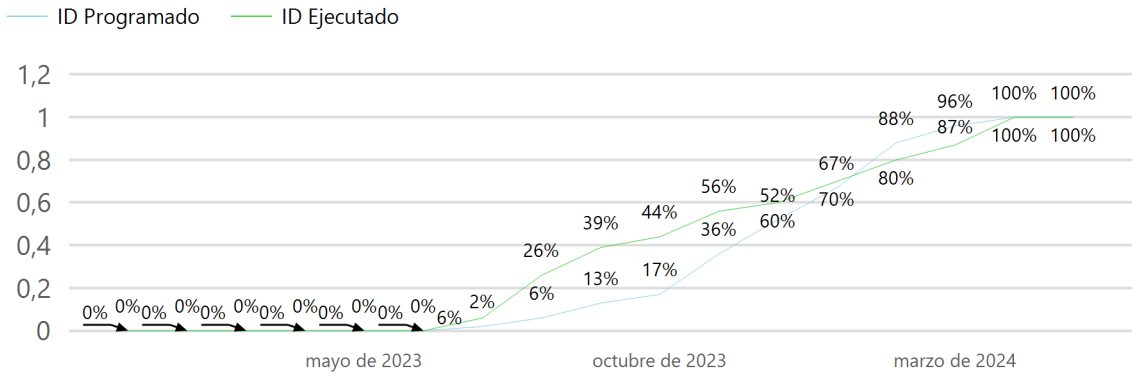

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026

Fecha de Corte Avance

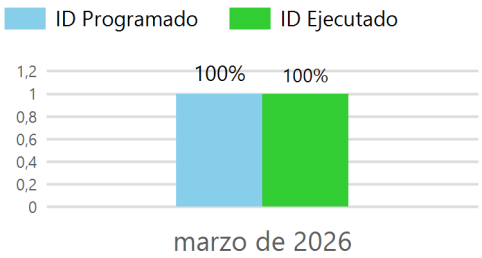

$9.365	100%
Valor Programado (mill)	% Programado
$9.362	100%
Valor Ejecutado (mill)	% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte
27/03/2026

Construcción de obras como estrategia de mitigación y control de inundaciones en la cabecera municipal de La Gloria, departamento del Cesar

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

$30.407 Valor Indicativo del Proyecto (millones)	En Liquidación Estado Detallado

$30.407 Aporte DNP FRPT (millones)	$0 Aporte Nación - Sector (millones)	$0 Aporte Territorio (millones)	$0 Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible	**Municipio Intervención**	La Gloria
BPIN	2021203830068	**Área de influencia**	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	140-2221130	**Es Inversión climática?**	Si
No. CONPES Anexo B	40	**Tiene viabilidad?**	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	**Fecha viabilidad**	19/05/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de 6.180,00 ml de dique como estructura de protección del casco urbano del municipio de la Gloria y de 200,00 m de muro en geocontenedor como protección de la orilla derecha del cauce del rio Simaña. Obras de dragado a lo largo de los 6.180,00 m objeto de intervención.	Obras para la prevención y control de inundaciones	6180 Longitud de sección hidráulica

Información específica de ejecución contrato específico

24/10/2022 Fecha de Suscripción	6/12/2022 Fecha de Inicio	28 Plazo en Meses	6/04/2025 Fecha Terminación	6.596 Número de Beneficiarios

$30.407 Pto Comprometido DNP FRPT	$0 Pto Comprometido Sector	$0 Pto Comprometido Territorio	$0 Pto Comprometido Otros

$30.407
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

6/04/2025 Fecha de Corte Avance	100% % Programado	100% % Ejecutado

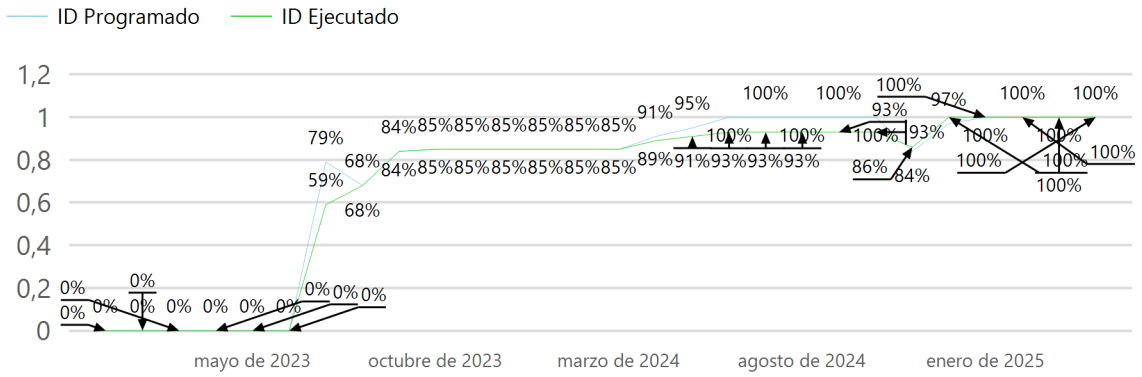

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026

Fecha de Corte Avance

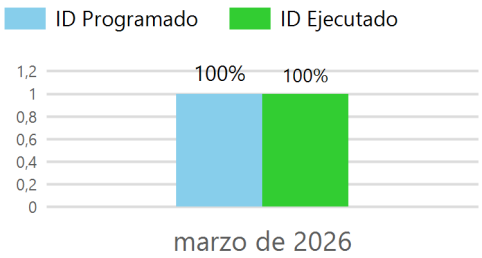

$30.407	100%
Valor Programado (mill)	% Programado
$30.403	100%
Valor Ejecutado (mill)	% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte
27/03/2026

Mejoramiento de vías secundarias y terciarias, Grupo 3, en el marco del Pacto Funcional Cesar - La Guajira, en el Departamento de Cesar (Grupo III)

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

$94.684	En ejecución de obra
Valor Indicativo del Proyecto (millones)	Estado Detallado

$87.847	$0	$6.837	$0
Aporte DNP FRPT (millones)	Aporte Nación - Sector (millones)	Aporte Territorio (millones)	Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	**Municipio Intervención**	Departamento de Cesar
BPIN	2021002200141	**Área de influencia**	Rural
No. Contrato Específico	144-2221131	**Es Inversión climática?**	No
No. CONPES Anexo B	100	**Tiene viabilidad?**	Si
Sesión CD inclusión PEI	6	**Fecha viabilidad**	04/06/2021

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Mejorar la condiciones de rodadura de sietes vías terciarias en seis municipios con un total de longitud de 64.84 km	Vía terciaria mejorada	64,84 Kilometros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

24/10/2022	6/02/2023	39	6/05/2026	329.245
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios

$87.847	$0	$16.423	$0
Pto Comprometido DNP FRPT	Pto Comprometido Sector	Pto Comprometido Territorio	Pto Comprometido Otros

$104.270
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

6/03/2026	100%	90%
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

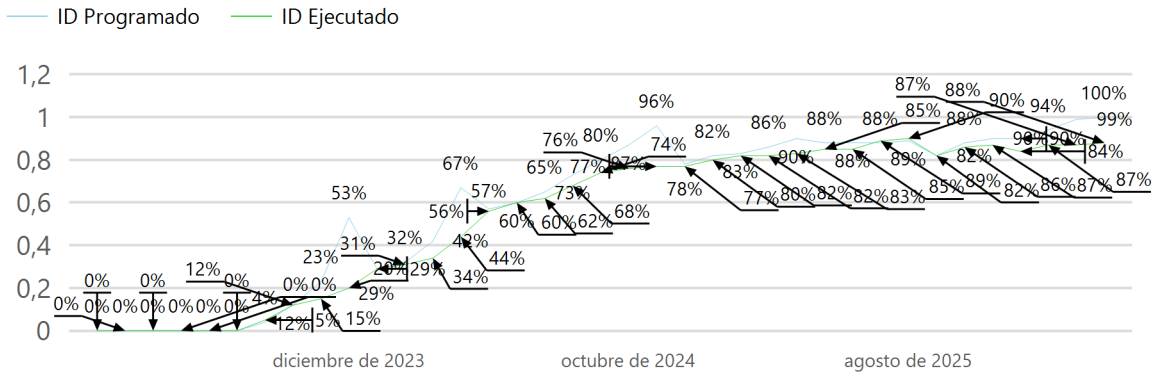

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026

Fecha de Corte Avance

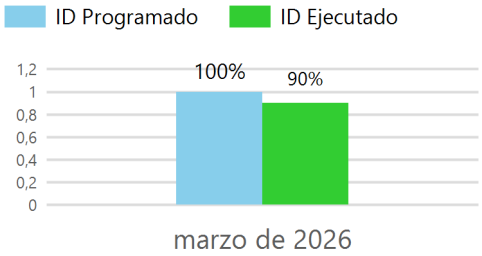

$87.847	100%
Valor Programado (mill)	% Programado
$79.062	90%
Valor Ejecutado (mill)	% Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte
27/03/2026

Mejoramiento de la red vial terciaria G2, en los municipios de Barrancas - Fonseca, Distracción, Hatonuevo y Albania, en el departamento de La Guajira.

Estado Proyecto
Terminado

Información general del contrato específico

$11.226	Ejecutado
Valor Indicativo del Proyecto (millones)	Estado Detallado

$11.226	$0	$0	$0
Aporte DNP FRPT (millones)	Aporte Nación - Sector (millones)	Aporte Territorio (millones)	Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	**Municipio Intervención**	Departamento de La Guajira
BPIN	2022442790035	**Área de influencia**	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	146-2221136	**Es Inversión climática?**	No
No. CONPES Anexo B	95	**Tiene viabilidad?**	Si
Sesión CD inclusión PEI	6	**Fecha viabilidad**	10/03/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
El proyecto consiste en la construcción de 6,36 km de tramos viales en los municipios de Barrancas - Fonseca, Distracción, Hatonuevo Y Albania, en el departamento de La Guajira específicamente en: Barrancas- Fonseca: K0+000.00 - K2+590 Distracción: K0+0.00 - K1+020.00 Hatonuevo: K0+000.00 - K1+391 Albania: K0+000.00 - K1+353 El proyecto en cuestión incluye las siguientes actividades: CONTROL Y MEDICIÓN PERMANENTE (COMISIÓN DE TOPOGRÁFICA). ESTRUCTURAS DE DRENAJE. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO. PLACA HUELLA	Vía terciaria mejorada	6,37 Kilómetros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

27/10/2022	11/01/2023	24	11/01/2025	157.188
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios

$11.226	$0	$0	$0
Pto Comprometido DNP FRPT	Pto Comprometido Sector	Pto Comprometido Territorio	Pto Comprometido Otros

$11.226
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

11/01/2025	100%	100%
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

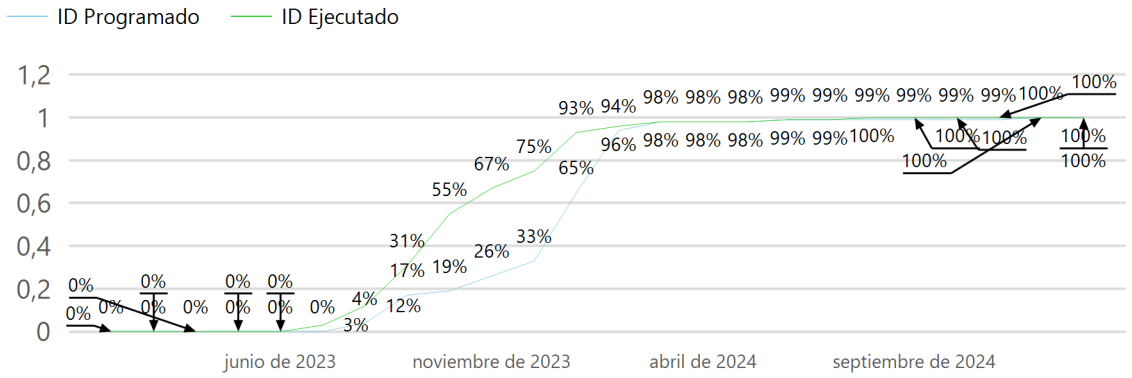

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026	$11.226	100%
Fecha de Corte Avance	Valor Programado (mill)	% Programado
	$11.226	100%
	Valor Ejecutado (mill)	% Ejecutado

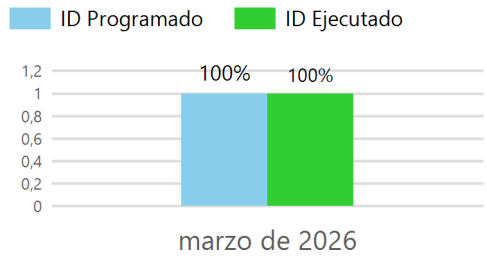

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte
27/03/2026

Construcción Plaza de Ventas - Galería de vendedores ambulantes Valledupar

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

$50.000	En ejecución de obra
Valor Indicativo del Proyecto (millones)	Estado Detallado

$50.000	$0	$0	$0
Aporte DNP FRPT (millones)	Aporte Nación - Sector (millones)	Aporte Territorio (millones)	Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Inclusión Social y Reconciliación	**Municipio Intervención**	Valledupar
BPIN	2022200010097	**Área de influencia**	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	147-2221139	**Es Inversión climática?**	No
No. CONPES Anexo B	83	**Tiene viabilidad?**	Si
Sesión CD inclusión PEI	1	**Fecha viabilidad**	01/07/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Construcción de una galería de vendedores con 354 locales , zona de parqueaderos, bloque administrativo y plazoleta para beneficiar a 484.453 habitantes	Plaza de mercado construida. 354 LOCLAES, con más de 9200 m2 construidos	1 unidades

Información específica de ejecución contrato específico

27/10/2022	30/12/2022	35	30/11/2025	484.453
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios

$50.000	$0	$0	$0
Pto Comprometido DNP FRPT	Pto Comprometido Sector	Pto Comprometido Territorio	Pto Comprometido Otros

$50.000
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

30/09/2025	100%	100%
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

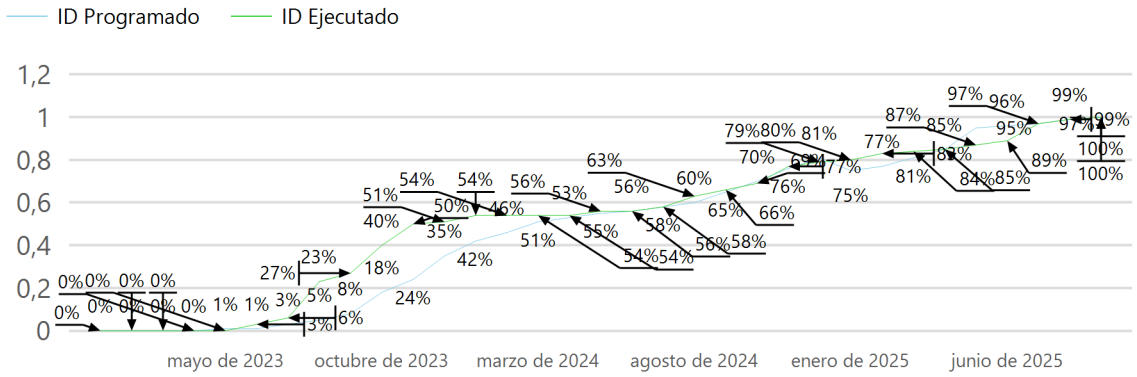

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026 Fecha de Corte Avance	
$50.000 Valor Programado (mill)	100% % Programado
$45.000 Valor Ejecutado (mill)	90% % Ejecutado

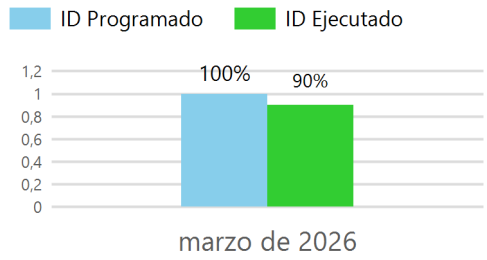

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte
27/03/2026

Mejoramiento De La Red Vial Terciaria G3, En Los Municipios De Maicao, Riohacha, Dibulla Y Uribia en el Departamento de La Guajira.

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

$28.562 Valor Indicativo del Proyecto (millones)	En ejecución de obra Estado Detallado

$28.562 Aporte DNP FRPT (millones)	$0 Aporte Nación - Sector (millones)	$0 Aporte Territorio (millones)	$0 Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	**Municipio Intervención**	Departamento de La Guajira
BPIN	2021002200141	**Área de influencia**	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	153-2221173	**Es Inversión climática?**	No
No. CONPES Anexo B	96	**Tiene viabilidad?**	Si
Sesión CD inclusión PEI	6	**Fecha viabilidad**	24/10/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
El proyecto consiste en la construcción de 13,74 km de tramos viales en en los Municipios de Maicao, Riohacha, Dibulla y Uribia, en el departamento de La Guajira, específicamente en: Maicao: alcance de 4.72 K.M Riohacha: - Las Palmas: alcance de 0.942 K.M. - La Gloria: alcance de 0.706 K.M. - Mongui: alcance de 2.991 K.M. Dibulla: alcance de 0.983 K.M. Uribia: Poportin: alcance de 3.4 K.M. El proyecto en cuestión incluye las siguientes actividades: *CONTROL Y MEDICIÓN PERMANENTE (COMISION DE TOPOGRAFIA). *ESTRUCTURAS DE DRENAJE. *PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO. *PLACA HUELLA.	Vía terciaria mejorada	13,74 Kilómetros de vías terciaria

Información específica de ejecución contrato específico

6/12/2022 Fecha de Suscripción	4/05/2023 Fecha de Inicio	35 Plazo en Meses	21/04/2026 Fecha Terminación	445.236 Número de Beneficiarios

$28.562 Pto Comprometido DNP FRPT	$0 Pto Comprometido Sector	$0 Pto Comprometido Territorio	$0 Pto Comprometido Otros

$28.562
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES Desarrollo regional con equidad

Avance físico del proyecto

4/07/2025	60%	41%
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

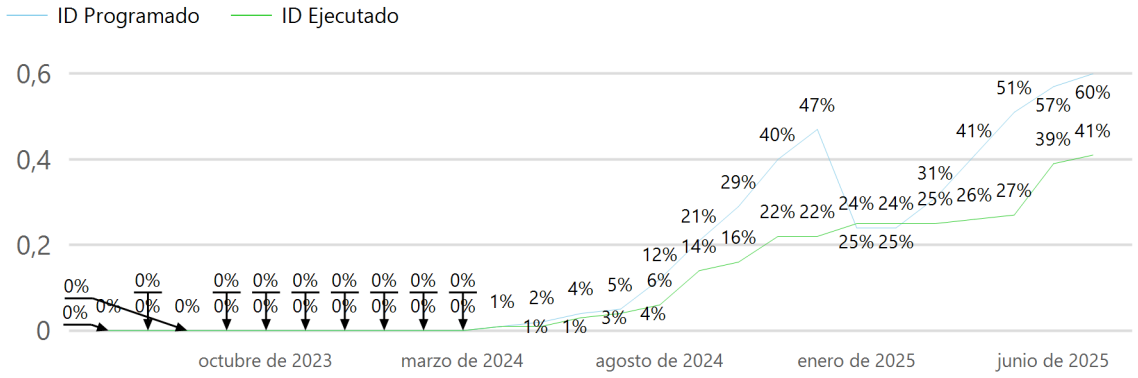

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026	$28.562	100%
Fecha de Corte Avance	Valor Programado (mill)	% Programado
	$19.337	68%
	Valor Ejecutado (mill)	% Ejecutado

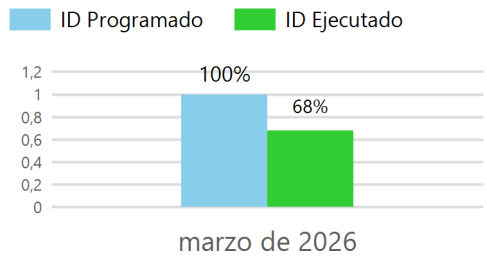

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte
27/03/2026

Desarrollo de acciones de emprendimiento y fortalecimiento microempresarial como estrategia de reactivación económica para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad en los municipios de La Paz, Pueblo Bello, San Diego, Manaure, Cesar

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

$12.012	En ejecución de obra
Valor Indicativo del Proyecto (millones)	Estado Detallado

$12.012	$0	$0	$0
Aporte DNP FRPT (millones)	Aporte Nación - Sector (millones)	Aporte Territorio (millones)	Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Inclusión Social y Reconciliación	**Municipio Intervención**	Pueblo Bello(Cesar), La Paz(Cesar), Manaure(Cesar), San Diego(Cesar)
BPIN	2020000020045	**Área de influencia**	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	161-2221182	**Es Inversión climática?**	No
No. CONPES Anexo B	54	**Tiene viabilidad?**	Si
Sesión CD inclusión PEI	2	**Fecha viabilidad**	17/12/2020

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Fortalecer la oferta institucional de estrategias de innovación empresarial en los municipios de Manaure, Pueblo Bello, Sandiego y La Paz en el Departamento de Cesar mediante resultados como: a)2.000 personas sensibilizadas y capacitadas en talleres de competencia emprendedora, competencia empresarial y educación financiera; b) inyección de capital semilla que arrojará como resultado120 empresas creadas, 600 empresas fortalecidas ,40 empresas asociativas creadas; c) 760 planes comerciales formulados; d) participación en 5 ferias y 1 rueda de negocio; y e) seguimiento y monitoreo a las 760 empresas apoyadas.	Servicio de apoyo a unidades productivas individuales para la generación de ingresos	760 unidades

Información específica de ejecución contrato específico

21/12/2022	13/03/2023	38	14/05/2026	2.000
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios

$12.012	$0	$33	$0
Pto Comprometido DNP FRPT	Pto Comprometido Sector	Pto Comprometido Territorio	Pto Comprometido Otros

$12.046
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

13/09/2025	100%	93%
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

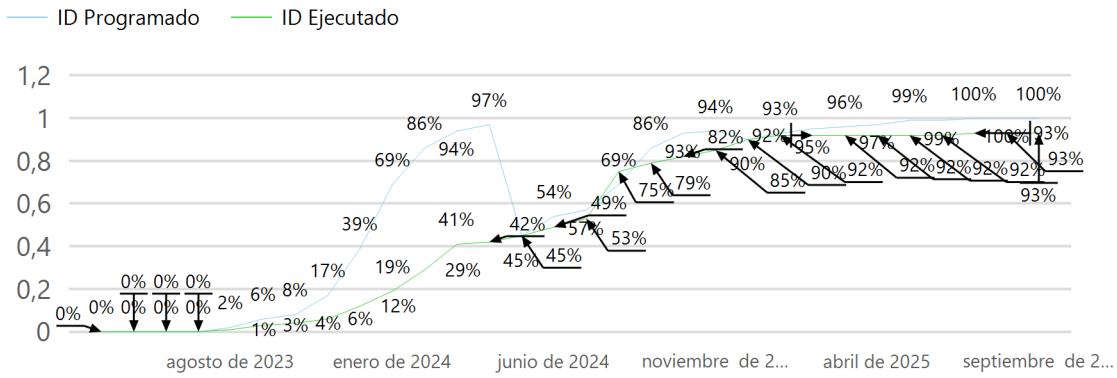

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026	$12.012	100%
Fecha de Corte Avance	Valor Programado (mill)	% Programado
	$10.811	90%
	Valor Ejecutado (mill)	% Ejecutado

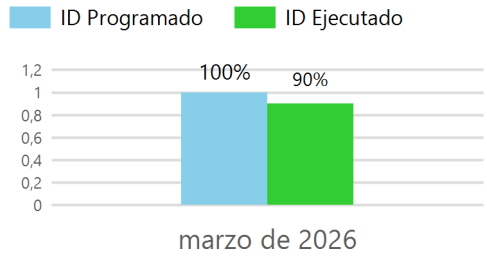

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte
27/03/2026

Construcción de puente vehicular sobre el paso crítico k9+294 vía Villanueva – Veracruz Municipio de Villanueva, Departamento de La Guajira

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

$2.000	En legalización de permisos,
Valor Indicativo del Proyecto (millones)	Estado Detallado
	obra

$2.000	$0	$0	$0
Aporte DNP FRPT (millones)	Aporte Nación - Sector (millones)	Aporte Territorio (millones)	Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Transporte	**Municipio Intervención**	Villanueva
BPIN	2022448740016	**Área de influencia**	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	182-2230150	**Es Inversión climática?**	No
No. CONPES Anexo B	146	**Tiene viabilidad?**	Si
Sesión CD inclusión PEI	6	**Fecha viabilidad**	22/06/2022

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
	Puente construido en vía terciaria	1
		Número de puentes

Construcción de un (1) puente vehicular L=25M sobre el paso critico k9+294 vía Villanueva-Veracruz.
La alternativa propuesta contempla la realización de las siguientes actividades: -EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA
-RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG-50 (Incluye suministro y transporte)
-DEMOLICION DE ESTRUCTURAS
-PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1.2 m, INCLUYE EXCAVACIÓN EN ROCA, BAJO AGUA
-CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU, PARA ZAPATAS
-CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - MEZCLA IN SITU, PARA TABLERO, VIGAS Y RIOSTRAS.
-CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU, PARA ESTRIBOS, BORDILLO, ALETAS Y LOSA DE APROXIMACION.
-CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) PARA SOLADO
-ACERO DE REFUERZO Fy 420 MPa, PARA ZAPATAS, ESTRIBOS, BORDILLO, LOSA DE APROXIMACION,TABLEROS Y VIGAS Y
RIOSTRAS.
-APOYO ELASTOMÉRICO REFORZADO
-RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE
-GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N
-BARANDA DE CONCRETO DE 28 MPA
-PRUEBA DE CARGA
-GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 3; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) Y PVC
-LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA TERMOPLÁSTICA
CARRILES: 2 ANCHO DE CARRILES 3 M
NO TIENE BERNA. NO TIENE ANDENES. NO TIENE BARRERA VEHICULAR

Información específica de ejecución contrato específico

23/06/2023	4/09/2023	32	10/05/2026	28.346
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios

$1.914	$0	$0	$0
Pto Comprometido DNP FRPT	Pto Comprometido Sector	Pto Comprometido Territorio	Pto Comprometido Otros

$1.914

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

Sin datos disponibles

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026

Fecha de Corte Avance

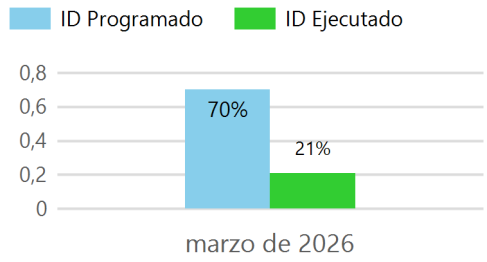

$1.914 Valor Programado (mill)	70% % Programado
$574 Valor Ejecutado (mill)	21% % Ejecutado

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte
27/03/2026

Construcción Adecuación y Mejoramiento del urbanismo sobre el malecón, Distrito de Riohacha, departamento de La Guajira

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

$70.000	En ejecución de obra
Valor Indicativo del Proyecto (millones)	Estado Detallado

$70.000	$0	$0	$0
Aporte DNP FRPT (millones)	Aporte Nación - Sector (millones)	Aporte Territorio (millones)	Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Comercio, Industria y Turismo	**Municipio Intervención**	RIOHACHA
BPIN	2022002440012	**Área de influencia**	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	191-2230172	**Es Inversión climática?**	No
No. CONPES Anexo B	57	**Tiene viabilidad?**	Si
Sesión CD inclusión PEI	5	**Fecha viabilidad**	16/06/2023

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
La propuesta urbana de la se diseñó bajo los criterios de desarrollo sostenible (social, económico, cultural y ambiental), enfocados en la recuperación y complementación de la infraestructura existente. Se planteó una propuesta general del proyecto en diferentes zonas, delimitadas específicamente por una red articuladora que integre escenarios múltiples preservando el entorno natural y resaltando el carácter histórico y cultural en su misma forma. la construcción adecuación y mejoramiento del urbanismo en un área de 79500 m2 y una longitud de 2.5 kilómetros en una sola planta, que incluirá zonas de deportes, restaurantes, tarima, ciclo ruta, kioscos y parques infantiles, entre otros, ideal para disfrutar de los mágicos atardeceres que ofrece Riohacha.	Espacio publico construido	79500 Metros Cuadrados

Información específica de ejecución contrato específico

28/06/2023	11/03/2024	31	11/10/2026	212.314
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios

$69.970	$0	$0	$0
Pto Comprometido DNP FRPT	Pto Comprometido Sector	Pto Comprometido Territorio	Pto Comprometido Otros

$69.970
Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

11/09/2025	49%	22%
Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

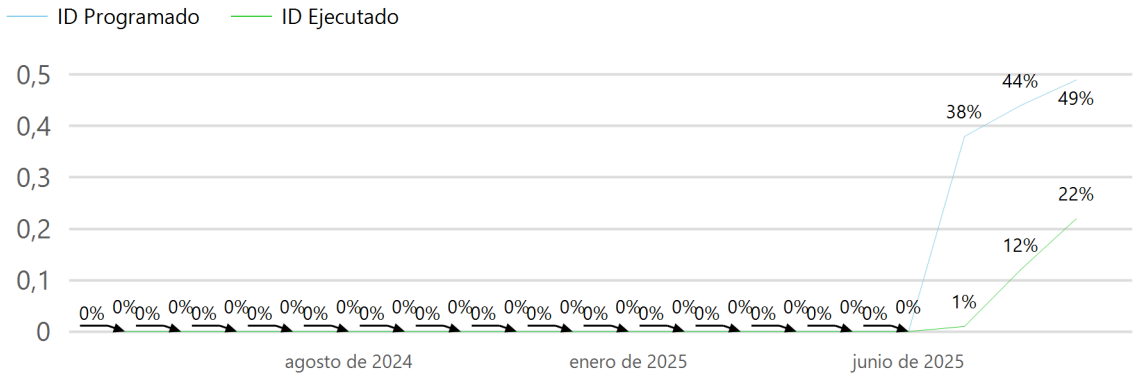

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026	$69.970	100%
Fecha de Corte Avance	Valor Programado (mill)	% Programado
	$27.000	39%
	Valor Ejecutado (mill)	% Ejecutado

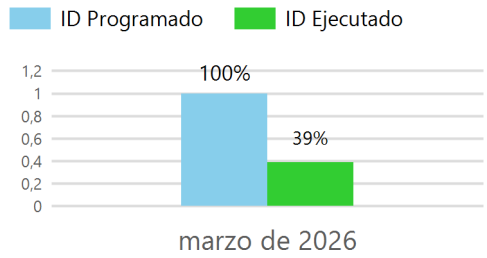

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

Pacto Territorial Cesar - La Guajira

Fecha de Corte
27/03/2026

Construcción de una Marina Multipropósito en Riohacha, Distrito Especial Turístico y Cultural, La Guajira

Estado Proyecto
En Ejecución

Información general del contrato específico

$32.000	En ejecución de obra
Valor Indicativo del Proyecto (millones)	Estado Detallado

$32.000	$0	$0	$0
Aporte DNP FRPT (millones)	Aporte Nación - Sector (millones)	Aporte Territorio (millones)	Otros Aporte (millones)

Sector de Inversión	Comercio, Industria y Turismo	**Municipio Intervención**	RIOHACHA
BPIN	2022002440009	**Área de influencia**	Urbano - Rural
No. Contrato Específico	193-2230174	**Es Inversión climática?**	Si
No. CONPES Anexo B	56	**Tiene viabilidad?**	Si
Sesión CD inclusión PEI	5	**Fecha viabilidad**	16/06/2023

Alcance	Producto Principal	Meta del Producto
Realizar los estudios requeridos y la preparación del terreno en la playa para desarrollar el proyecto de construcción de La Marina(Prospección arqueológica y ensayos) Realizar el dragado y construcción de 3 espolones de contención en piedra que garantice el funcionamiento de La Marina en esa zona.(Excavaciones y Dragado, espolón de contención, luminaria solar para espolones)Construcción de un muelle fijo de 714 M2 compuesto por rampas de acceso, plataformas y espacios de prestación de servicios y baños que sirvan a los turistas que accedan a la marina ya sea por tierra o por mar. (Cimentación por medio de pilotes, Fabricación de plataforma,acabado, edificación en estructura metálica, fabricación e instalación de rampas de acceso a muelle fijo y barandas en plataforma). Construir muelle flotante que sirva de atracadero a las embarcaciones que arriben a La Marina multipropósito, con un área total de 8.630 m2 con 3 líneas de atraque de embarcaciones o fingers y torretas de servicios para las embarcaciones, cornamusas de amarre e iluminación. Realizar el montaje de las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias que permitan garantizar la electricidad, iluminación, baños y agua potable para brindar servicios óptimos a turistas y personal de funcionamiento de La Marina multipropósito. Propender por el buen desarrollo, seguimiento, control y vigilancia de las obras de construcción de la Marina multipropósito garantizando los recursos para realizar la interventoría y cubrir gastos administrativos y otros componentes necesarios para su ejecución (PMA, Bioseguridad Covid, licencia ambiental, Interventoría del proyecto y gastos administrativos y demás tramites técnicos y legales.	Marina construida	1 UND

Departamento Nacional de Planeación

Ficha Proyectos Fondo Regional de Pactos Territoriales

PACTOS TERRITORIALES
Desarrollo regional con equidad

Información específica de ejecución contrato específico

28/06/2023	11/03/2024	36	11/03/2027	212.314
Fecha de Suscripción	Fecha de Inicio	Plazo en Meses	Fecha Terminación	Número de Beneficiarios

$31.794	$0	$0	$0
Pto Comprometido DNP FRPT	Pto Comprometido Sector	Pto Comprometido Territorio	Pto Comprometido Otros

$31.794

Presupuesto Comprometido Total (millones)

Avance físico del proyecto

Fecha de Corte Avance	% Programado	% Ejecutado

Sin datos disponibles

Avance Financiero del proyecto

27/03/2026

Fecha de Corte Avance

$31.794	100%
Valor Programado (mill)	% Programado
$6.400	20%
Valor Ejecutado (mill)	% Ejecutado

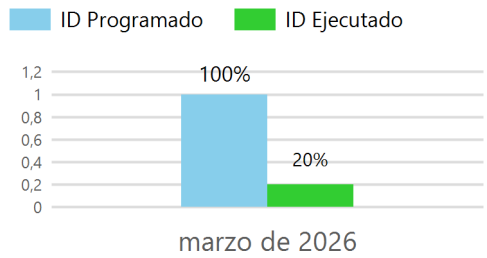

* Los proyectos que se encuentran en estado Comprometidos, no presentan datos en el avance de la ejecución física y/o ejecución financiera, dado que están en proceso de lagalización de contratos específicos o de contratación de obra e interventoría.
