



INFORME DE GESTIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN- PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2015

Julio de 2015

INTRODUCCIÓN

Este informe contiene la información relacionado con el seguimiento a los avances de los proyectos de inversión que se realiza a través del Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión SPI, sistema que se cerró el pasado 13 de julio de 2015 para el periodo Junio 30 de 2015 (I semestre de 2015), que contiene la última información de avance de los proyectos con corte al periodo mencionado.

Se complementa además con el indicador de calidad y oportunidad donde se mide la consistencia de las metas y los indicadores frente a la ejecución financiera y compromisos adquiridos; y la calidad y oportunidad en el registro del cronograma de actividades, resumen ejecutivo e imagen asociada, igualmente se incluye el reporte del indicador de ejecución a la fecha de corte indicada anteriormente.

En este documento se presenta en primer lugar un cuadro resumen de la ejecución financiera- “Indicador de Ejecución” de los recursos de inversión ejecutados en la vigencia 2015 con corte al primer semestre (junio) 2015.

En segundo lugar un cuadro resumen de la información del seguimiento Físico, de Gestión, Financiero – compromisos y el Índice de Calidad de cada uno de los proyectos a la fecha.

Seguidamente se desagrega por proyecto, resaltando los logros y metas más relevantes alcanzadas con corte a 30 de junio 2015

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP

A. Ejecución Financiera de los recursos de inversión de la vigencia 2015

El Departamento Nacional de Planeación, a través de los recursos de inversión asignados durante la vigencia 2015, programo 14 proyectos de inversión, por valor inicial de **\$532.505.586.981**. Sin embargo el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico con Decreto 0377 del 4 de marzo aplazo apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación equivalente para la entidad en recursos de inversión a **\$58.557.667.124**, quedando finalmente vigente asignado para la vigencia 2015 un valor de **\$473.947919.857**.

A 30 de junio se cuenta con un valor vigente disponible de **\$191.540.982.999**, descontando recursos del proyecto de Distribución por valor de \$282.406.936.858

A 30 de junio de 2015, se ha ejecutado el 6,40% del total de los recursos asignados con aplazamiento, y se tienen comprometidos el 27% de la apropiación disponible.

CUADRO 1- RECURSOS DE INVERSION VIGENCIA 2015

RECURSOS ASIGNADOS EN LA VIGENCIA 2015 Y DISPONIBLES A 30 DE JUNIO 2015	
Inicial	532.505.586.981
Aplazamiento	58.557.667.124
Disponible con Aplazamiento	473.947.919.857
Menos Distribución	282.406.936.858
Apropiación Disponible Vigente	191.573.899.801

En el siguiente cuadro se detalla el nombre del proyecto, la apropiación vigente, las obligaciones y pagos efectuados a 30 de junio de 2015

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN - EJECUCION PROYECTOS DE INVERSIÓN
I SEMESTRE 2015**

CUADRO 2- EJECUCION DE RECURSOS DE INVERSION VIGENCIA 2015

Nombre Proyecto	APROBACION INICIAL	APROPIACION CON APLAZAMIENTO	APROPIACION DISPONIBLE A 30 DE JUNIO DE 2015	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS
DESARROLLO IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	7.000.000.000	6.228.854.670	6.228.854.670	2.635.081.418	1.518.113.528	1.518.113.528
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD A NIVEL NACIONAL	1.900.000.000	1.690.689.125	1.690.689.125	1.373.319.709	273.896.664	262.940.002
DISEÑO Y ARTICULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS, ESTRATEGIAS, LINEAMIENTOS Y DEMÁS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL.	17.700.000.000	15.750.103.952	15.750.103.952	4.478.311.586	1.727.842.940	1.727.842.940
APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE EFICIENCIA AL SERVICIO DEL CIUDADANO	10.688.000.000	9.510.571.245	9.510.571.245	3.701.283.991	1.114.522.528	1.114.522.528
APOYO A ENTIDADES PÚBLICAS NACIONALES, PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, DE CONVERGENCIA Y DESARROLLO REGIONAL A NIVEL NACIONAL	417.457.706.981	382.711.472.990	100.304.536.132	0,00	0,00	0,00
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS E INVERSIÓN PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL. NACIONAL	27.800.000.000	24.737.451.404	24.737.451.404	20.071.663.330	6.524.073.358	6.512.239.398
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL DE LARGO PLAZO NACIONAL	18.150.000.000	16.150.530.323	16.150.530.323	8.927.158.926	2.385.163.895	2.283.382.899
APOYO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA LOGÍSTICA NACIONAL	2.700.000.000	2.402.558.230	2.402.558.230	1.500.710.114	832.031.811	818.838.355
APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TRANSPORTE URBANO EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESTRATEGIA DE VIVIENDA Y CIUD. AMABLES NACIONAL	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.480.183.367	491.801.810	467.202.800
FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN PÚBLICA NACIONAL-	600.000.000	533.901.829	533.901.829	0,00	0,00	0,00
REMODELACIÓN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DNP EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	3.000.000.000	2.669.509.144	2.669.509.144	0,00	0,00	
ADQUISICION DE PISOS PARA LA SEDE DEL DNP EN BOGOTÁ	12.664.880.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION Y DE GESTION DE RESULTADOS - SINERGIA EN EL NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL	11.087.000.000	9.865.615.961	9.865.615.961	7.071.569.794	1.263.445.706	1.250.910.706
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	258.000.000	229.577.786	229.577.786	0,00	0,00	0,00
	532.505.586.981	473.980.836.659	191.573.899.801	51.239.282.235	16.130.892.240	15.955.993.156

B. Avance en la ejecución Física, Gestión, Calidad y Financiero de los recursos de inversión de la vigencia 2014

En cuanto al seguimiento a los proyectos de inversión para el cierre del Primer Semestre de la vigencia 2015, se observa que el avance físico alcanzo el **50,30%**, el de gestión el **69,4%**, el financiero el **6,45%**, con base en los indicadores reportados en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI. Se calcula además el indicador de calidad y oportunidad donde se mide la consistencia de las metas y los indicadores frente a la ejecución financiera; y la calidad y oportunidad en el registro del cronograma de actividades, resumen ejecutivo e imagen asociada, obteniendo el DNP un **60%** de cumplimiento. Tal como se indica en la gráfica anterior y en el siguiente cuadro discriminado por proyecto.


Código BPIN	Nombre Proyecto	EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	EJECUCION FISICA (%)	EJECUCÓN EN GESTION (%)	INDICE TOTAL CALIDAD
2011011000216	DESARROLLO IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	24%	53%	53%	78
2011011000243	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD A NIVEL NACIONAL	16%	24%	76%	70
2011011000306	DISEÑO Y ARTICULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS, ESTRATEGIAS, LINEAMIENTOS Y DEMÁS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL.	11%	34%	42%	58
2012011000579	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE EFICIENCIA AL SERVICIO DEL CIUDADANO	12%	27%	46%	52
2013011000566	APOYO A ENTIDADES PÚBLICAS NACIONALES, PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, DE CONVERGENCIA Y DESARROLLO REGIONAL A NIVEL NACIONAL	0%	80%	100%	100
2013011000023	FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS E INVERSIÓN PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL. NACIONAL	26%	0%	9%	58
2013011000197	FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL DE LARGO PLAZO NACIONAL	15%	0%	77%	46

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN - EJECUCION PROYECTOS DE INVERSIÓN
I SEMESTRE 2015**

Código BPIN	Nombre Proyecto	EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	EJECUCION FISICA (%)	EJECUCÓN EN GESTION (%)	INDICE TOTAL CALIDAD
2013011000316	APOYO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA LOGÍSTICA NACIONAL	35%	25%	83%	82
2013011000408	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TRANSPORTE URBANO EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESTRATEGIA DE VIVIENDA Y CIUD. AMABLES NACIONAL	33%	0%	67%	66
2014011000272	FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN PÚBLICA NACIONAL-	0%	0%	0%	34
2011011000274	REMODELACIÓN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DNP EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	0%	0%	0%	34
27065270000	ADQUISICION DE PISOS PARA LA SEDE DEL DNP EN BOGOTA	0,00	0%	0%	34
2014011000087	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION Y DE GESTION DE RESULTADOS - SINERGIA EN EL NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL	13%	36%	13%	84
2011011000315	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C	0%	0%	0%	39
TOTAL		6,45%	50,30%	69,4%	60

- 1) Avance Físico: Refleja el avance de los bienes y servicios cuantificables producidos y/o provisionados directamente por el proyecto.
- 2) Avance en Gestión: Refleja avance en procesos, acciones y operaciones adelantados dentro la etapa de implementación proyecto.
- 3) Avance Financiero: Recursos Obligados / Apropriación Vigente
- 4) Índice de Calidad y Oportunidad de la Información de Formulación y Seguimiento de los Proyectos de Inversión (ICOPÍ).

Grafica No 1 - Comportamiento Físico, de Gestión, Calidad y Financiero

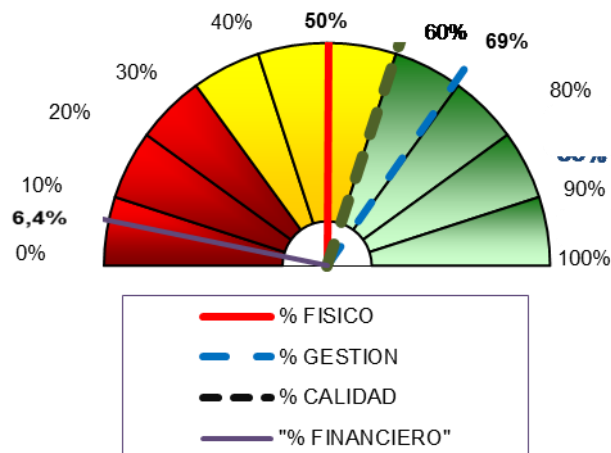

1. Apoyo a Entidades Públicas Nacionales, para Programas y Proyectos para el Desarrollo Económico, Social, de Convergencia y Desarrollo a Nivel Nacional /2013011000566

Código BPIN	Nombre Proyecto	EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	EJECUCION FISICA (%)	EJECUCÓN EN GESTION (%)	INDICE TOTAL CALIDAD
2013011000566	APOYO A ENTIDADES PÚBLICAS NACIONALES, PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, DE CONVERGENCIA Y DESARROLLO REGIONAL A NIVEL NACIONAL	89%	80%	100%	100

Logros y Metas

- Durante el primer semestre de la vigencia 2015, en el marco del objetivo de este proyecto y bajo la figura presupuestal de distribuciones, se asignaron recursos a con 25 proyectos de diferentes entidades de estado, superando la meta de 10 proyectos propuesta a 30 de Junio de 2015
- Igualmente a la fecha se ha logrado apoyar (10) iniciativas en el marco de la figura de “Contratos Plan” programas que benefician el desarrollo económico y social del país.
- A la fecha del total asignado con aplazamiento de \$417.457.706.981, se ha desembolsado un total de recursos de \$282.406.936.858, quedando pendiente un saldo de \$135.050.770.123

2. Desarrollo implementación y mantenimiento de servicios de tecnología de información y comunicaciones en el Departamento Nacional de Planeación /2011011000216

Código BPIN	Nombre Proyecto	EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	EJECUCION FISICA (%)	EJECUCÓN EN GESTION (%)	INDICE TOTAL CALIDAD
2011011000216	DESARROLLO IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	24%	53%	53%	78

Los recursos asignados para la vigencia 2015 con aplazamiento corresponden a \$6.228.854.670, los cuales se vienen ejecutando de manera normal

Logros y Metas

A través del cumplimiento de las metas planeadas en el primer semestre de 2015 se han obtenido los siguientes logros:

- Se han Gestionado y atendido los os servicios de TIC soportados en la plataforma tecnológica de la Entidad

- Con relación con el objetivo “Desarrollar, actualizar y mejorar los Sistemas de Información que soportan el cumplimiento de las funciones misionales y de apoyo de la Entidad”, se ha contado con soluciones en materia de soporte de alto nivel frente a problemas en temas de afinamiento de las diferentes configuraciones asociadas a la plataforma Microsoft, lo cual ha permitido estabilidad en los servicios prestados, proyección de necesidades, así como el mejoramiento de las aplicaciones y Sistemas de Información que apoyan el cumplimiento de las funciones del DNP y los servicios que actualmente se prestan a los usuarios finales internos y externos de la plataforma tecnológica del DNP.
- Se ha logrado fortalecer, mejorar y modernizar la plataforma tecnológica del DNP para soportar la prestación de servicios de TIC, a través de adquisiciones de bienes de TIC le permiten a la Entidad:
 - ✓ Continuar con el proceso de independencia de los diferentes ambientes de los sistemas de información del DNP (Desarrollo, Pruebas, Producción).
 - ✓ Actualización de la plataforma tecnológica de la Entidad, asegurando la prestación de nuevos servicios, que permitan mejorar la productividad y eficiencia en la utilización de los recursos.
 - ✓ Minimizar los riesgos de pérdida de información.
 - ✓ Mejorar la capacidad computacional que permitan mayor productividad y eficiencia en el análisis de la información
- Se atendieron en promedio 323 de los 347 incidentes recibidos mensualmente.
- Se han mantenido los servicios misionales de TIC Habilitados – Disponibles, el servicio de CORREO e INTERNET estuvo disponible en el semestre y no se reportó en la herramienta de gestión ningún caso sobre indisponibilidad del servicio.
- Se han desarrollado nuevas funcionalidades de Sistemas de información o portales misionales y de apoyo Desarrolladas (Orfeo (3): 1) Implementar Sub-Expedientes (Volúmenes o Carpetas) - PGD (en el marco del Programa de Gestión Documental - PGD) 2) Implementación Encuesta de atención al ciudadano (En pruebas por parte de SA) 3) Nuevas funcionalidades en el Digitalizador de Orfeo. Sisgestión (3))
- Se actualizo el Hardware, Software, infraestructura de redes a través de la adjudicación del proceso de SAS y Enterprise Architect Plataforma tecnológica para Hardware, software e infraestructura redes actualizadas.
- Se publicó el proceso de Centro de Servicios, Conectividad y Data Center. Se presentaron dos firmas y ambas quedaron habilitadas para la subasta del día 14 de julio para el proceso de contratación de OFFICE 365 en la cual se encuentra la continuidad del servicio de correo en la nube
- Prestación del Servicio Premier sobre la plataforma tecnológica en ejecución, se presentó el tercer informe relacionado del contrato premier.
- Se firmaron 3 contratos de prestación de servicios profesionales por los meses de Enero, Febrero y Marzo. Se Suscribieron nuevos contratos (3) de prestación de servicios profesionales por los meses de Abril a Diciembre de 2015. Los contratos están en Ejecución.

3. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Competitividad a Nivel Nacional /2011011000243

Código BPIN	Nombre Proyecto	EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	EJECUCION FISICA (%)	EJECUCÓN EN GESTION (%)	INDICE TOTAL CALIDAD
2011011000243	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD A NIVEL NACIONAL	16%	24%	76%	70

El proyecto consiste en Fortalecer el Sistema Nacional de Competitividad (SNC) en el país con base en el diseño e implementación de políticas de desarrollo con potencial de transformar el aparato Productivo Nacional e integrar de manera coherente los lineamientos acciones de todos los sistemas y subsistemas relacionados con la competitividad y la productividad.

Logros y Metas

- Se avanzó en planteamiento de propuesta temática y conceptual como insumo inicial para la elaboración de contenido de documento de política de análisis del estado de la competitividad en Colombia. Esta propuesta será entregada al director de la DDE el próximo 7 de julio
- Se desarrollaron 200 encuesta al sector empresarial
- Encuesta de percepción de la Innovación Social en Colombia, el formulario de la encuesta en su versión online tiene un avance de acuerdo al reporte de la oficina de informática del 80%. Se inicia en el segundo semestre
- Se están diseñando las piezas de comunicación por parte de Urna de Cristal para la campaña de socialización que durará 5 semanas a partir del 27 de Julio.
- Fue aprobado en comité el convenio con el OCYT. Es cual inició y se encuentran en proceso de entrega el primer producto programado para el mes de julio.
- El Documento con la descripción de la composición del gasto en ciencia, tecnología e innovación en Colombia, se decidió que este producto estaría a cargo de Colciencias por lo cual se eliminó de la cadena de valor del proyecto.
- Se decidió con el Banco Mundial contratar al IPA para recolección de datos entre oct.14 y dic.14, para la elaboración del documento de Evaluación de impacto del Programa Piloto de Extensión Tecnológica.
- Se elaboró un estudio de Estudios sobre Política industrial y comercial
- Se realizaron las 180 capacitaciones programadas para la vigencia 2015 y se entregó material de apoyo

4. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Evaluación y Gestión de Resultados SINERGIA en el Nivel Nacional y Territorial /2014011000087

Código BPIN	Nombre Proyecto	EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	EJECUCION FISICA (%)	EJECUCÓN EN GESTIÓN (%)	INDICE TOTAL CALIDAD
2014011000087	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION Y DE GESTION DE RESULTADOS - SINERGIA EN EL NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL	13%	36%	13%	84

La Constitución Política de 1991 (Art. 343) estableció el mandato de diseñar y organizar los sistemas de seguimiento y evaluación de gestión y resultados de las políticas y proyectos implementados por el Gobierno Nacional. Posteriormente, la Ley Orgánica 152 de 1994 facultó al DNP como el ente encargado del diseño y organización de estos sistemas. Como resultado a lo anterior se creó el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA, cuyo propósito es mejorar la efectividad en la formulación y ejecución de las políticas públicas, en particular las incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), consolidando sus tres componentes: seguimiento al PND, evaluaciones de Políticas estratégicas y Sinergia territorial.

Logros y Metas:

Para la vigencia 2015, el proyecto tuvo una apropiación con aplazamiento de \$9.865.615.961

- Se elaboró el Boletín de Política Pública el cual será publicado en Julio
- Fueron aprobados por el comité de contratación del 23 de junio los estudios previos para la Contratación de la encuesta de percepción, con los cuales se abrió el concurso de méritos CM-005-15
- A la fecha se tienen implementados los sistemas de seguimiento de los siete (7) Contratos Plan construidos, implementados y firmados.
- Se ha venido trabajando en Observatorio de políticas públicas en el diseño del conjunto de indicadores de seguimiento para el observatorio de **política de la familia**. Allí se especificarán (i) Indicadores sobre las estructuras y dinámicas demográficas de las familias
- Para dar cumplimiento al sistema de seguimiento a metas de gobierno implementadas a la fecha se han adelantado las pruebas de aceptación de usuario, estabilizando el sistema, preparación de la carga del nuevo PND mediante la entrega de los módulos de: Gerente de Meta, Coordinador, Sectorialista, Alto Gobierno. Territorial y Evaluaciones.
- A la fecha se han socializado las siguientes cuatro (4) evaluaciones finalizadas en el 2014: Centros Regionales de Educación Superior (CERES);
 - Política de Atención Humanitaria;
 - Programas SFV y SFVE;
 - Síntesis de Evaluación SITMs
- A la fecha las siguientes evaluaciones terminaron en la agenda, el subproceso de diseño y de la evaluación:
 - Política de interrelación entre el Catastro y el Registro;
 - Instrumentos de Gasto Público en Ciencia, Tecnología e Innovación

5. Diseño y Articulación de los Instrumentos, Estrategias Lineamientos y Demás Requerimientos Técnicos Necesarios para el Desarrollo de la Política Pública de Protección Social a Nivel Nacional/ 2011011000306

Código BPIN	Nombre Proyecto	EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	EJECUCION FISICA (%)	EJECUCIÓN EN GESTION (%)	INDICE TOTAL CALIDAD
2011011000306	DISEÑO Y ARTICULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS, ESTRATEGIAS, LINEAMIENTOS Y DEMÁS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL.	11%	34%	42%	58

El proyecto consiste en diseñar y articular los instrumentos, estrategias, lineamientos y demás requerimientos técnicos necesarios para el desarrollo de la Política Pública de Protección Social.

Los siguientes eslabones son competencia directa del DNP, en marco de la cadena de valor de la focalización del gasto social:

Obtención de datos: Consiste en la aplicación de los mecanismos de obtención de datos de las familias en el SISBEN.

Gestión de datos: Consiste en el ingreso de los datos al sistema y la administración de éstos a través de las diferentes funcionalidades que se requieren en el software.

Procesamiento de datos: Consiste en la validación de los datos para transformarlos en información útil y de calidad para la focalización del gasto social. Este procesamiento se enmarca en tareas de Cruces y validación de datos con otras fuentes. El resultado del ejercicio es la conformación de la base de datos consolidada del SISBEN a un corte determinado.

Entrega de información: Entrega de la base certificada para el proceso de selección de beneficiarios en el marco de la focalización del gasto social por parte de las entidades que ofrecen programas.

En este sentido, como instrumentos complementarios al SISBEN para mejorar la focalización del gasto social y como parte del diseño de la política social, el DNP realiza un trabajo continuo en función del cálculo y el análisis de un tablero de control de las condiciones de vida, que consta de los siguientes grupos de indicadores: 1) Pobreza y desigualdad de ingresos autónomos; 2) Pobreza y desigualdad después de subsidios (incidencia del gasto social) y 3) Índice de Pobreza Multidimensional de Oxford para Colombia e Índice de Oportunidades Humanas. En el caso de la pobreza por ingresos autónomos, el cálculo se realiza en el marco de la Misión para el Empalme de las Series de Mercado Laboral, Pobreza y Desigualdad MESEP.

Adicionalmente, en el marco de la Política de Protección Social, los desarrollos técnicos referidos deben avanzar y estar en capacidad de interactuar de manera pertinente con los desarrollos inherentes a ésta en ámbitos como: (i) los lineamientos técnicos y de política para la focalización de los programas sociales; (ii) las políticas y estrategias para la superación de la pobreza, la vulnerabilidad y el mejoramiento de la calidad de vida de la población; (iii) el fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano y la Seguridad Social Integral, (iii) (iv) las estrategias y política para el manejo del Riesgo Social (variantes); y (iv) las políticas

Para la vigencia 2015, el proyecto tuvo un monto de \$ 15.750.103.952 con aplazamiento

El proyecto de inversión cuenta hoy con unos 11 mil millones, que son para el Barrido del SISBEN con el nuevo instrumento después del piloto.

Tramite de Traslado a proyectos del DNP

Vale la pena aclarar que el piloto del Sisben que llevará a nuevos resultados y mejoras en los procedimientos en búsqueda de una mejor focalización de la población vulnerable y potenciales beneficiarios de la oferta de programas sociales del Estado, tiene un presupuesto proyectado para la realización de estas actividades entre los años 2015 al 2018. Se basa en la actual metodología pero hasta no conocer los resultados definitivos del piloto no se podrán tener cifras exactas del presupuesto para la actualización del instrumento Sisben, ya que se van a implementar nuevos procesos, entre los cuales tenemos la utilización de los Dispositivos Móviles de Captura (DMC) para la recolección de la información.

Los resultados tendrán que ser aprobados por el Conpes, para poder ser implementados en todos los municipios del país, y definir el presupuesto del 2016 al 2019 del proyecto de inversión. Sin embargo por los temas de vigencia del presupuesto y la modificación al cronograma de implementación del nuevo instrumento Sisben, no se contaría con el tiempo suficiente para iniciar en esta vigencia (2015) dicho proceso, de acuerdo a la experiencia con anteriores procesos de actualización del Sisben.

Debido a los tiempos que se tienen para este año 2015, la Dirección de Desarrollo Social **NO alcanza a comprometer todo el monto en un convenio con FONADE, puesto que este debe ser aprobado en CONPES; tener vigencias futuras tramitadas para salir a negociar el convenio interadministrativo.** Adicionalmente la metodología del nuevo instrumento puede hacer que los montos del barrido se eleven, lo cual podría llevar a tramites presupuestales adicionales.

Los tiempos **NO** dan en el cronograma para comprometer este monto de recursos con toda la carga administrativa que se requiere, sí, el CONPES es aprobado y se logra sacar un convenio con FONADE

Con base en lo anterior se consideró prudente no tener un monto tan alto de recursos a ejecutar este año, y si se puede solucionar necesidades en otras áreas del DNP que lo requieren por lo tanto se destinan para este trámite de traslado un valor de **\$2.600.000.000**, distribuidos de la siguiente manera:

Recursos Requeridos Vigencia 2015	
Proyectos	Valor
Proyecto Fortalecimiento	600.000.000
Proyecto Sectorial	1.500.000.000
Proyecto DIES- transporte Urbano	500.000.000
Total	2.600.000.000

Logros y Metas

- Se encuentra en consolidación de cifras y análisis del sistema de indicadores socio demográficos con la GEIH
- Conjuntamente con el DANE se está recolectando la información y se espera que con esta información se elabore el documento de seguimiento a la ELPS, se tiene estimado su entrega para el segundo semestre de 2015

- Con relación a la nueva metodología del Índice SISBEN diseñada, a la fecha se firmaron los convenios con los municipios del piloto Sisben, para probar la metodología y realizar los ajustes necesarios
- Se ha dado cumplimiento a cortes de la Base SISBEN Resolución 4060 del 2014, en la cual relacionan las fechas de los cortes de las bases
- Con relación a La INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, se está actualizando el software por medio del convenio con FONADE para el piloto del Sisben, se espera probarlo en campo con los convenios con los municipios
- A la fecha ya se cuenta con las cifras para la elaboración del Documento de análisis anual de pobreza a partir de la metodología de pobreza multidimensional Elaborados

6. Implementación del Programa Nacional de Eficiencia al Servicio del Ciudadano/2012011000579

Código BPIN	Nombre Proyecto	EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	EJECUCION FISICA (%)	EJECUCIÓN EN GESTIÓN (%)	INDICE TOTAL CALIDAD
2012011000579	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE EFICIENCIA AL SERVICIO DEL CIUDADANO	12%	27%	46%	52

La Política de Buen Gobierno tiene como uno de sus pilares garantizar que las entidades de la Administración Pública ofrezcan a los ciudadanos un servicio basado en principios de calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia.

Este compromiso se ha venido materializado en un conjunto de acciones de política para mejorar la gestión de las entidades y conseguir que los ciudadanos no tengan que incurrir en cargas y costos innecesarios cuando interactúan con las entidades públicas.

Los recursos asignados para el proyecto para la vigencia 2015 corresponden a recursos del crédito BID por valor de \$5.488.000.000 y con recursos Nación \$5.200.000.000, para un total de \$10.688.000.000 pesos, que con aplazamiento quedaron en \$9.510.571.245

En la misma línea que los años 2013 y 2014, el PNSC busca en el 2015 enfocar sus esfuerzos en la ejecución de los frentes estratégicos abordados en dichas vigencias, agrupados en las siguientes líneas de acción:

- ❖ Intervención Institucional y Territorial
- ❖ Herramientas y Medición
- ❖ Talento Humano para el Servicio
- ❖ Promoción para el servicio y Lenguaje Claro

1. Intervención Institucional y Territorial

Estrategia

- En el marco de la política pública establecida en el CONPES 3785 de 2014, el Programa precisó la estrategia de intervención institucional en las entidades del orden nacional, el

programa puntualizará un acompañamiento integral para la adopción del portafolio de herramientas para el servicio al ciudadano a un grupo de “Entidades Priorizadas”. Se cubrirán las siguientes fases: contextualización, diagnóstico, plan de acción Integral, acompañamiento a la implementación, seguimiento y medición de cierre para validar los impactos alcanzados. En marzo de 2015, se presentó la estrategia, ante 143 Servidores Públicos de 86 entidades.

- Se adelantó el 2o. Encuentro del Equipo Transversal de Servicio al Ciudadano y se recibió la aceptación de las 22 entidades elegidas.

Comenzaron las Asesorías por demanda. Se ha brindado asesoría a las siguientes entidades

- Contraloría General de la República
- Defensoría del Pueblo
- Ministerio de Salud y Protección Social
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- ICBF
- Unidad de Consolidación Territorial
- Instituto Colombiano Agropecuario
- ICA
- Superintendencia de Registro y Notariado
- Congreso de la República
- Ecopetrol
- Sociedad de Activos Especiales
- COLCIENCIAS

Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano

Para el 2015, el DNP programó la realización de 7 Ferias

- Turbo (Antioquia) 25 de abril
- Pitalito (Huila), 30 de mayo
- Buenaventura (Valle del Cauca), 11 de Julio
- Dosquebradas (Risaralda), 1 de agosto
- Acacias (Meta), 12 de septiembre
- Quibdó (Chocó), 17 de octubre
- Arjona (Bolívar), 28 de noviembre
- Se elaboró y presentó el Plan de Acción detallado por cada feria y se establecieron las especificaciones requeridas al operador logístico. En el presente mes se llevó a cabo la segunda Feria en Pitalito (30 de mayo)

Intervención Territorial

En el primer trimestre de 2015 se presentó la estrategia de intervención territorial del Programa, cuyo eje de acción enmarca en la suscripción y ejecución de convenios interadministrativos entre el DNP y las entidades territoriales comprometidas con la adopción del portafolio de herramientas del Programa para el mejoramiento del servicio

- En los 5 primeros meses del año el DNP suscribió convenios con las siguientes entidades territoriales: Gobernación de Caldas; Alcaldía de Manizales; Gobernación de Antioquia; Alcaldía de Medellín; Gobernación de Cauca; Alcaldía de Popayán; Gobernación de

Santander; Alcaldías de Bucaramanga, Piedecuesta, Floridablanca y Girón y Alcaldía de la Calera.

A la fecha encuentran perfeccionados, con numeración por parte del DNP, todos los convenios.

- En el marco de esta intervención, en junio se ha implementado la nueva metodología de Sistema de Servicio al Ciudadano, en la Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín y la Alcaldía de la Calera (cadenas de trámites).
- Finalmente, durante en el primer trimestre se presentó el documento "Criterios para la definición de la oferta de trámites y servicios del orden nacional y territorial – SI ", el cual fue validado con los actores involucrados.

d) Centros Integrados de Servicio – SI

A través de este eje estratégico se busca la implementación en 4 años, de los **SI de Chaparral, San Andrés, Tumaco y Buenaventura**, con el fin de promover el acceso de los ciudadanos a la oferta de Información, trámites y servicios de la Administración Pública, con calidad, oportunidad y eficiencia, mediante la integración de servicios de varias entidades nacionales y territoriales bajo un mismo espacio físico y/o solución tecnológica.

- **SI–Chaparral:** A junio, se firmó el Convenio Interadministrativo con la Alcaldía Municipal de Chaparral, mediante el cual queda formalizada la destinación del inmueble por parte del municipio y se viabiliza legalmente la posibilidad de adecuar e intervenir el mismo para la construcción del CIS. Se cuenta con un cronograma previo, que es la hoja de ruta de la intervención, incluyendo los temas de ajustes al diseño, reforzamiento, adecuación y dotación inmobiliaria, como ejes del componente arquitectónico de la estrategia en Chaparral.
- **SI - San Andrés:**
En este período se acordó agenda con las entidades para validar y dimensionar trámites a prestar en San Andrés, presencia institucional en cuanto a servidores y cargas y se elaboraron los Términos de Referencia para la Racionalización y Optimización de Trámites por parte del consultor seleccionado Para ello en un proceso que se iniciará en el mes de julio de 2015.

Durante el mes de junio, una vez realizadas las concertaciones previas con MINTIC y DAFP se Elaboraron los Términos de Referencia para la contratación de una consultoría que se encargue de la racionalización y optimización de aproximadamente 210 trámites, que son los que se han priorizado y validado con las entidades territoriales.

- **Centros Nacionales y Binacionales de Atención Fronteriza (CENAB – CEBAF)**

En el primer trimestre del año se elaboró un documento que describe el modelo de servicio al Ciudadano a ser implementado en estos centros. Para llevar a cabo esta iniciativa, ya se encuentra completo el equipo encargado de desarrollarla. Se han llevado a cabo reuniones con Cancillería y Otras áreas involucradas del DNP, para definir el Plan a seguir en la implementación.

2. **Herramientas y Medición**

- Se diseñarán las siguientes herramientas: autodiagnóstico de accesibilidad y espacios físico; formatos de recepción y reglamento PQR; cartas de trato digno; portafolios de oferta institucional, guía de perfiles de competencia y de vinculación; planes de contingencia; metodología de intervención para el mejoramiento del servicio al ciudadano; acuerdo de uso del pensum de cultura de servicio al ciudadano; e internamente la herramienta de medición del avance y resultados de la intervención. Al corte de junio Se actualizaron las herramientas previstas en el plan de acción interno.
- A su vez, se diseñaron las siguientes herramientas: Metodología de Intervención para el Mejoramiento del Servicio al Ciudadano, Acuerdo de uso del pensum de cultura de servicio al ciudadano, la herramienta de Unidades por Competencia para el Servicio al Ciudadano; y la guía de Planes de Contingencia
- Dentro del convenio suscrito con el CIDCCA, en el año se han realizado visitas de diagnóstico a los espacios físicos del Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Comando General de las Fuerzas Militares y el Departamento Nacional de Planeación, a partir de las cuales se están generando insumos para el documento de análisis sobre el estado de cumplimiento de la NTC 6047.
- También se ha venido acompañando al DNP en el planteamiento de un modelo de seguimiento y evaluación del servicio en el marco del SGR. Para ello, se ha participado en la mesa técnica del SGR y se está trabajando en la reorganización de las encuestas e instrumentos de medición desarrollados en la Entidad.

3. **Talento Humano para el Servicio**

Cualificación de Servidores Públicos

- Se fortalecieron las competencias de los servidores públicos, para que puedan responder eficientemente a los requerimientos e inquietudes de los colombianos a través de ciclos de capacitación Con respecto a la estandarización de los procesos que definan los perfiles, competencias y los protocolos de selección del personal de servicio al ciudadano, se aseguró la participación en el proyecto “Competencias de servidores e innovación en el servicio”, articulando las actividades concertadas con el DAFP y GEL
- Por otro lado, con el fin de identificar las necesidades de cualificación y sensibilización de los servidores públicos, se tabuló el resultado de 489 encuestas diligenciadas por servidores de atención directa al ciudadano.
- Producto de la concertación con la ESAP, se logrará desarrollar la estrategia de cualificación a servidores en temáticas específicas de servicio al ciudadano. A la fecha, se

están trabajando los términos de referencia para la contratación (con recursos créditos) con esta entidad.

- Al corte de junio, se han cualificado y/o sensibilizado a 1292 servidores de Entidades del SNSC, en el marco de los diferentes eventos y reuniones del programa.
- Se diseñaron 4 talleres de sensibilización para aplicar con las Entidades pertenecientes al SNSC.
- Finalmente, se revisó el protocolo de virtualización de contenidos de la Dirección Nacional de Servicios Académicos Virtuales de la Universidad Nacional, para identificar aspectos de virtualización y establecer el contacto para la posibilidad de realizar un convenio.
- A su vez se identificaron 11 Entidades que cuentan con escuelas virtuales, con el fin de establecer las plataformas y contenidos desarrollados con esta metodología. Se reiteró una solicitud similar con la ESAP.

4. Comunicación para el Servicio y Lenguaje Claro

a) Comunicación para el Servicio

- La estrategia de comunicación del PNSC fue socializada el 17 de marzo en el Primer Encuentro del Equipo Transversal de Servicio al Ciudadano.
- A la fecha se ha habilitado el correo PNSCtecomunica@dn.gov.co y se han publicado 11 boletines del Programa, cumpliendo con el cronograma establecido.
- Continúa el acompañamiento en comunicaciones en todos los eventos realizados por PNSC.
- Adicionalmente, se ha supervisado la solicitud de elaboración y recepción del material promocional del Programa.

b) Lenguaje Claro

- Se definió el cronograma de actividades para desarrollar la estrategia de Lenguaje Claro. La primera actividad realizada fue la validación con todos los actores involucrados de la Guía de Lenguaje Claro elaborada por el PNSC. Se cuenta entonces con una versión diagramada y editada para ser presentada a la Alta Dirección.
- La tarea pendiente continúa siendo la contratación de los laboratorios de simplicidad. A la fecha se
- Elaboraron los términos de referencia (contratación con recursos crédito) y se han solicitado comunicaciones de interés a posibles proponentes.
- También se ha planteado la inclusión de proyectos tipo del SGR como parte de las piezas comunicativas a tratar.
- El reto mayor para el Programa en el presente año será el de articular las iniciativas enmarcadas
- en la política pública de servicio al ciudadano (CONPES 3785), bajo un nuevo modelo operativo, que permita abordar la gestión de forma integral para poder posicionar el servicio al ciudadano como la razón de ser de las entidades públicas y al Programa, como una

herramienta imprescindible para asegurar la confianza en las instituciones y la paz en el territorio colombiano

- Un reto puntual para el año 2015 continúa siendo la ejecución operativa del Crédito con el BID, que será la columna vertebral de la implementación de los Centros Integrados de Servicio, programa bandera del PNSC

7. Fortalecimiento de la Planeación y Coordinación de las Políticas e Inversión Pública para la Gestión del Desarrollo Territorial Nacional/ 2013011000023

Código BPIN	Nombre Proyecto	EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	EJECUCION FISICA (%)	EJECUCIÓN EN GESTION (%)	INDICE TOTAL CALIDAD
2013011000023	FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS E INVERSIÓN PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL. NACIONAL	26%	0%	9%	58

El proyecto se orienta a desarrollar y promover un impacto en políticas e inversión pública, generando herramientas y acuerdos institucionales que fortalezcan las capacidades de gestión pública de los diferentes niveles de gobierno y demás actores del desarrollo territorial, cerrando las brechas existentes entre los territorios.

Se han propuesto cuatro grandes frentes a través de este proyecto de inversión:

- Desarrollar herramientas, información y estudios necesarios para incorporar criterios de eficiencia, regionales, ambientales y de grupos poblacionales específicos, en la formulación de políticas públicas y en la asignación de la inversión pública
- Definir e implementar mecanismos para articular las decisiones de planeación e inversión de los distintos actores del desarrollo local y regional
- Apoyar la definición, formulación, estructuración y gestión de proyectos de inversión para el desarrollo territorial.
- Fortalecer las capacidades institucionales de las entidades nacionales y territoriales y de grupos poblacionales, para planear y gestionar el desarrollo regional (el PND 2010-2014 estableció la obligación del DNP de diseñar y coordinar la ejecución de un Programa de Generación y Fortalecimiento de las Capacidades Territoriales para el Desarrollo

Los recursos asignados para la vigencia 2015, ascienden a \$ 24.737.451.404 con aplazamiento

Logros y Metas

Desarrollar metodologías, sistemas de información y estudios necesarios para incorporar criterios regionales, ambientales, poblacionales y de eficiencia, en la formulación de políticas públicas y en la toma de decisiones de inversión pública.

- Se encuentran en proceso de elaboración los 3 documentos de análisis sobre el desarrollo territorial.

- Se cuenta con el Review Territorial de la OCDE y con el documento "Tipologías municipales y departamentales" y con un documento de bases de la política General de ordenamiento Territorial.

Apoyar la definición, formulación, estructuración y gestión de proyectos de inversión de interés público.

- Con relación a la plataforma integrada de Inversión pública se encuentra en implementación final y estabilización la plataforma base de servicios y el módulo web de la nueva MGA a través de la firma Microsoft Colombia

Apoyar la definición, formulación, estructuración y gestión de proyectos de inversión de interés público.

- La DDTS presta apoyo a las ET en la estructuración de proyectos de inversión de desarrollo.

Definir e implementar mecanismos para articular las decisiones de planeación e inversión de los distintos actores del desarrollo local y regional.

- Se realiza acompañamiento a la ejecución de 7 contratos plan y 2 Acuerdos de Desarrollo Urbanos.
- Se inició proceso de negociación de 5 nuevos Contratos Plan

Municipios con actualización catastral cofinanciados

- La cofinanciación cobijará a 20 entidades territoriales en la vigencia 2015.
- La cofinanciación dada desde el proyecto será del % 15 del valor total de la actualización de cada ET.

Fortalecer las capacidades institucionales y organizacionales de las entidades nacionales y territoriales

- Para las entidades territoriales con modelo de gestión territorial, se implementaron en 50 entidades territoriales con la herramienta Migestión, que permite realizar seguimiento a áreas de la gestión.
- La DDT acompaña técnicamente el desarrollo de esquemas asociativos priorizados

8. Fortalecimiento de la Planeación Estratégica Sectorial de Largo Plazo Nacional/ 2014011000197

Código BPIN	Nombre Proyecto	EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	EJECUCION FISICA (%)	EJECUCIÓN EN GESTION (%)	INDICE TOTAL CALIDAD
2013011000197	FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL DE LARGO PLAZO NACIONAL	15%	0%	77%	46

El proyecto se orienta a Fortalecer la planeación y orientación de políticas públicas sectoriales, así como de programas y proyectos estratégicos para el desarrollo económico y social del país.

El proyecto propende desarrollar 4 estrategias:

- Definir y desarrollar una agenda de investigaciones que permita anticiparse a los problemas y generar visión de mediano y largo plazo como base para el desarrollo del país.
- Liderar la estructuración de proyectos entre el sector público y privado sobre los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo.
- Mejorar la producción y gestión de información pública.
- Fortalecer al CONPES como instrumento de direccionamiento y toma de decisiones de políticas públicas.

El proyecto solicito recursos por valor de \$18.150.000.000,00 los cuales con base en el Decreto 377 de marzo 2015 se redujeron a \$ 16.150.530.323 para ejecutar en esta vigencia.

Logros y Metas

Consolidar herramientas de planeación para orientar el diseño e implementación de políticas públicas, así como de planes, programas y proyectos sectoriales.

- Con relación a los documentos de seguimiento y control a las políticas, programas, planes y proyectos de desarrollo económico y social del país, se tienen programados 2 documentos para esta vigencia a la fecha están pendientes de entrega.
- Los estudios para la estructuración de políticas, proyectos, planes o programas Diseñados e implementados se tienen previstos 10 para esta vigencia A la fecha no se han iniciado están en proceso precontractual
- Se continuara con el Apoyo al Consejo Nacional de planeación para el desarrollo de estudios y diseño de metodologías.

Promover la participación privada en proyectos que faciliten el desarrollo de la infraestructura productiva y social inherente a la finalidad del Estado.

- Se contrataron y están en elaborados 3 estudios o documentos de análisis sobre el desarrollo territorial
- Se contemplaron eventos de capacitación y socialización en los proyectos de participación privada a realizar en esta vigencia en numero 15. A la fecha se han capacitado 7 entidades de orden nacional

- La asesoría de apoyo para la estructuración y desarrollo de esquemas de asociación público privadas, se debe contratar 1 en esta vigencia, se encuentra en proceso precontractual.
- **Contratos Plan:** Se desarrollan los estudios que promuevan la participación privada en infraestructura, elaborados apoyados y/o financiados por el programa en el marco de los planes de desarrollo sectorial, se consideran ejecutar 6 en esta vigencia, a la fecha se aprobó POA con los estudios a realizar en el marco del Crédito APP.
- Análisis de la justificación sobre la modalidad de contratación para la utilización del instrumento de APP, se han considerado 3 para esta vigencia los cuales deben quedar elaborados e implementados en proyectos de infraestructura.
- La elaboración de normas, marcos regulatorios y/o institucionales se han considerado realizar al menos una (1), en esta vigencia la cual a la fecha está en proceso de elaboración.

Consolidar al CONPES como instancia de direccionamiento, articulación y toma de decisiones para apoyar la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas.

- Se debe actualizar la plataforma tecnológica web CONPES, a la fecha se inició proceso de validación de requerimientos de la plataforma.
- Como complemento a lo anterior se han programado 7 eventos de capacitación para este tema, están en proceso de programación a la fecha.

Desarrollar análisis de coyuntura y prospectiva para la planeación estratégica sectorial de largo plazo.

- Para los documentos de coyuntura y prospectivas sectorial, se realizó contratación para apoyo en el desarrollo de documentos
- Se deben programar y realizar eventos de socialización de los documentos de análisis, prospectivas, documentos técnicos de seguimiento y/o evaluación sectorial realizados, para lo cual se tiene un evento programado en esta vigencia una vez se encuentre el documento elaborado y aprobado.
- Igualmente para Documentos técnicos de seguimiento y/o evaluación sectorial elaborados, se inició proceso precontractual para la elaboración de los mismos. Se tiene programado 2 documentos para esta vigencia.
- Se debe apoyar la estructuración de proyectos de inversión.
- Se continuara apoyando y trabajo con entidades territoriales en el modelo de gestión territorial hasta su implementación.

Traslado

Este proyecto también fue beneficiado por el traslado de recursos del proyecto de la Dirección de desarrollo Empresarial por valor de \$1.500.000.000, que serán destinados a cumplir compromisos adquiridos relacionados con el Plan de Expansión que propone iniciar la identificación, preparación e inicio de 10 Contratos Plan adicionales entre 2015 y 2017, siguiendo los lineamientos y criterios establecidos en el documento CONPES 3822 CONTRATOS PLAN:

“LINEAMIENTOS DE POLÍTICA Y PLAN DE EXPANSIÓN 2014 -2018”. Esto incluye la incorporación de ajustes consensuados entre la Nación y los departamentos a los Contratos Plan actuales, a través de un proceso de re-negociación que asegure la adopción de los criterios complementarios. De igual forma, y para lograr una mayor apropiación de los sectores, involucra la participación más activa de los ministerios y entidades en las etapas de priorización y negociación.

Con este objetivo, en la vigencia 2015 el DNP apoyará la estructuración, firma y puesta en marcha de 5 Contratos Plan. Con estos, se consolidará la herramienta Contratos Plan en diferentes territorios del país y se pasará de la etapa piloto a la etapa de desarrollo de los mismos como mecanismo de gobernanza multinivel, y como potencial herramienta para el ordenamiento y la asociatividad territorial.

9. Apoyo Técnico para la Implementación de las Estrategias de la Política Logística Nacional / 2013011000316

Código BPIN	Nombre Proyecto	EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	EJECUCION FISICA (%)	EJECUCIÓN EN GESTION (%)	INDICE TOTAL CALIDAD
2013011000316	APOYO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA LOGÍSTICA NACIONAL	35%	25%	83%	82

La Política Nacional de Competitividad y Productividad estructurada en el CONPES 3527 busca posicionar al país como una “economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado”.

En ese sentido, y con el objetivo de apoyar el desarrollo del transporte y la infraestructura del país, el DNP a través de la Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible apoyará y fortalecerá las acciones de implementación de la Política Nacional Logística (PNL), lo cual redundará en un impacto directo sobre la productividad de las locomotoras del cuatrienio a través de la reducción de los costos y tiempos logísticos de distribución física de bienes y la generación de información logística del país.

El objetivo del proyecto permite optimizar los procesos de distribución física de bienes, garantizando su correcta articulación con el territorio y su conectividad con las redes de transporte y con los nodos de comercio exterior, optimizando la estructura de costos y contribuyendo de esta forma a mejorar la Competitividad del país.

Para la vigencia de 2015 se aprobaron recursos por \$ 2.402.558.230 incluido el aplazamiento dichos recursos.

Logros y Metas

Con base en el Fortalecimiento del entorno institucional para tomar acciones coordinadas y enfocadas hacia un mismo objetivo que logren sinergias que contribuyan a la competitividad del país a través de la optimización del desempeño logístico nacional.

- Se está consolidando la información para la elaboración del segundo informe trimestral de las actividades de seguimiento a la implementación de la Política Nacional Logística en su componente técnico

Generar información mediante el desarrollo de una metodología que permita la recolección y publicación de información específica que oriente la formulación de políticas y acciones que promuevan la adopción de mejores prácticas en logística.

- La Encuestas Logísticas se encuentra en etapa de análisis para realizar la respectiva actualización
- Se realizó la revisión y rediseño de los instrumentos de medición para la actualización de la Encuesta Nacional de Logística en 2015.
- Se diseñó el Plan de Comunicaciones y marco muestral.

Apoyar el desarrollo de las Infraestructuras Logísticas Especializadas que permitan un aumento del flujo de bienes y servicios y por ende una reducción de los costos de la distribución física de los productos.

- Se está construyendo una primera versión de documento Estudio de estructuración técnica, legal y financiera de una ILE con requerimientos técnicos para la estructuración Técnica de una Zona de Actividades Logísticas - ZAL en el Distrito de Buenaventura
- Diseño preliminar fue validado y enriquecido por entidades públicas y privadas, logrando obtener el modelo final de actividades de negocio, operación y actividades económicas de la ZAL de Buenaventura logrando obtener recursos para la inversión en la comunidad
- Se construyó el informe de resultados y conclusiones del Estudio de identificación de requerimientos de una plataforma logística agrícola en el que se identifica el diseño de una solución logística, a nivel de pre factibilidad, para el producto del sector hortofrutícola (Aguacate), incluyendo características de las cadenas productivas, de infraestructura y logística).
- Se aprobó el primer producto ajustado de la primera etapa la implementación y puesta en marcha de la estrategia EGES del proyecto de diseño de la estrategia de consolidación del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas. Se recibió el segundo producto para revisión

Apoyar en la optimización de los servicios prestados por las entidades gubernamentales en el marco de la Política de Comercio Exterior.

- Se realizó monitoreo, seguimiento y evaluación del proyecto de apoyo.

Fomentar el desarrollo de empresas especializadas en logística y transporte que presten servicios de calidad en logística y oportunidad amigables con el medio ambiente.

- Se está revisando el alcance.

10. Apoyo a la Implementación de la Política de Transporte Urbano en los Municipios de la Estrategia de Vivienda y Ciudades Amables Nacional Plazo Nacional/ 2013011000408

Código BPIN	Nombre Proyecto	EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	EJECUCION FISICA (%)	EJECUCÓN EN GESTION (%)	INDICE TOTAL CALIDAD
2013011000408	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TRANSPORTE URBANO EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESTRATEGIA DE VIVIENDA Y CIUD. AMABLES NACIONAL	33%	0%	67%	66

El objetivo del proyecto es generar en los municipios del país que hacen parte de la estrategia de Vivienda y Ciudades Amables del PND en los componentes: "Sistemas Amables Binacionales", "Estrategia para Ciudades Pequeñas" y "Sistemas Integrados de Transporte Público", herramientas para mejorar las condiciones de movilidad en los mismos, buscando la adecuada articulación entre todos los modos de transporte.

El objetivo específico del proyecto es la estructuración de mecanismos de política, alineados con los instrumentos de ordenamiento territorial, que establezcan los planes, programas y proyectos necesarios, a adoptar por parte de las administraciones locales para organizar las condiciones de movilidad en su municipio.

Para cada uno de los municipios, comprende las Siguienes actividades principales:

- ✓ •Elaboración de un plan de trabajo y metodología para el desarrollo de los estudios.
- ✓ •Recopilación de la información secundaria para caracterizar la movilidad del territorio.
- ✓ •Recopilación de la información primaria para complementar la caracterización de la movilidad del territorio y elaboración de un diagnóstico que detalle las condiciones encontradas.
- ✓ •Formulación de la estrategia de movilidad que articule la planeación del territorio con la de la Movilidad
- ✓ •Supervisión y Administración del proyecto de inversión El proyecto pretende durante cada vigencia de ejecución, apoyar como mínimo a tres municipios con la formulación de instrumentos que les permitan mejorar sus condiciones actuales de movilidad.

La localización propuesta para los años de ejecución del proyecto es la siguiente, resaltando que es posible que las dinámicas de los municipios generen nuevas priorizaciones y que eventualmente se considere estratégico apoyar a otro territorio diferente de los que se señalan a continuación:

- 2014: Ciénaga, San Andrés, Fusagasugá y Maicao –Lorica
- 2014-2015: Tunja, Duitama, Sogamoso
- 2015: Tuluá, Pitalito, Valledupar, Maicao, Montería
- 2016: Tuluá, Puerto Asís. Saravena.

- 2017: Pitalito, Zipaquirá y Quibdó

Logros y Metas

De igual forma se iniciaron las consultorías de estructuración del SITR de Boyacá y de Modos Alternativos para los municipios de Lórica, Montería, Maicao y Valledupar.

Durante 2015 no se contratarán consultorías adicionales a las ya en curso contratadas a través de recursos de vigencias futuras desde 2014 y que tienen que ver con la estructuración del SITR de Boyacá y de Modos Alternativos para los municipios de Lórica, Montería, Maicao y Valledupar, lo anterior debido a las restricciones fiscales, por lo tanto el alcance de las actividades a ejecutar en esta vigencia se ajustó, para conciliarlo con las posibilidades de ejecución presupuestal.

Durante la vigencia 2015, con recursos del proyecto de inversión se apoya:

- Avance en la caracterización de la movilidad del municipio, mediante la información secundaria existente, fue aprobado el Producto No. 2 Contrato 530-2014 relacionado.
- Caracterización detallada, diagnóstico y análisis de la movilidad del municipio, en función del insumo de la actividad preliminar y la información primaria recolectada. El Comité de seguimiento avanzó en la revisión del producto 3 del contrato 511-2014.
- Para el contrato 530-2014 el producto asociado a esta actividad fue entregado en versión definitiva durante el periodo
- Se formuló la estrategia de movilidad que articula la planeación del territorio con la de la movilidad, e impartir un taller de divulgación de resultados a los habitantes del municipio, el Gobierno Local y el Gobierno Nacional. De acuerdo con el contrato DNP-511-2014 se entregó el producto asociado a esta actividad el 16 de junio.
- Para el contrato DNP-530-2014 el producto fue aprobado el 30 de junio.
- Se recibió el informe 4 del contrato DNP-511-2014, conforme a lo descrito en el reporte de Actividades.

Traslado

Este proyecto recibió recursos del trámite de traslado del proyecto de la Dirección de Desarrollo por un valor de \$500.000.000 para cubrir la necesidad de apoyar a la Región Capital con el diseño de estrategias para la implementación de la Primera Línea de Metro de Bogotá, por ser una obra que contribuirá al desarrollo integral de la movilidad de Región Capital Bogotá - Cundinamarca, lo que la hace un tema prioritario para el Gobierno Nacional. Social fue beneficiado.

11. Adquisición de Pisos para la Sede del DNP en Bogotá / 27065270000

Código BPIN	Nombre Proyecto	EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	EJECUCION FISICA (%)	EJECUCÓN EN GESTION (%)	INDICE TOTAL CALIDAD
27065270000	ADQUISICION DE PISOS PARA LA SEDE DEL DNP EN BOGOTA	0,00	0%	0%	34

El objetivo del proyecto consiste en contar con la capacidad indispensable y necesaria para la reubicación de sus colaboradores en condiciones aceptables.

En el marco de los recientes desarrollos normativos en materia de Regalías se le han asignado al DNP nuevas funciones. Lo anterior ha redundado no solo en el incremento del número de requerimientos y en la complejidad de su procedimiento; si no que a su vez ha hecho necesario atender las necesidades logísticas y administrativas que se derivan.

En este contexto el DNP ha tenido que incrementar su personal, situación que sumada al déficit de espacio exige una solución física.

De esta forma por medio de este proyecto se pretende adquirir nuevos pisos con parqueaderos, auditorios y locales en el sector donde funciona el DNP, es decir, en la zona comprendida entre la carrera 10 y 13 y la calle 26 y 28 y según el estudio de mercado realizado en dicha zona se concluye que se puede adquirir pisos entre 350 y 500 metros cuadrados aproximadamente para alojar aproximadamente 895 colaboradores.

El proyecto **No** reportara avance dado a que el 4 de marzo el Decreto 377 de 2015, aplaza de manera **total** los recursos del proyecto de adquisición de pisos para esta vigencia 2015

Con relación a la Elaboración de estudio para identificar y realizar la estructuración técnica legal y financiera de una alternativa que permita al DNP y FONADE solucionar sus necesidades de espacio físico, dado a que el 4 de marzo el Decreto 377 de 2015, **aplaza de manera total los recursos del proyecto de adquisición de pisos para esta vigencia 2015.**

12. Remodelación, Adecuación y Mantenimiento de la Infraestructura Física del DNP en la Ciudad de Bogotá D.C. /2011011000274

Código BPIN	Nombre Proyecto	EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	EJECUCION FISICA (%)	EJECUCÓN EN GESTION (%)	INDICE TOTAL CALIDAD
2011011000274	REMODELACIÓN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DNP EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	0%	0%	0%	34

Infraestructura Remodelada de los pisos del DNP No se ha podido ejecutar, en primer lugar por el aplazamiento presupuestal realizado por MHCP el 4 de marzo de 2015 con el Decreto 377, donde aplaza de manera parcial los recursos del proyecto de remodelación para esta vigencia

Adicionalmente de FONADE no autorizó para realizar las remodelaciones en pisos de FONADE por lo tanto se está adelantando lo pertinente para la remodelación del piso 5 de Gomez, sede también del DNP.

13. Fortalecimiento de la Innovación Social en La Gestión Pública Nacional /2014011000272

Código BPIN	Nombre Proyecto	EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	EJECUCION FISICA (%)	EJECUCÓN EN GESTION (%)	INDICE TOTAL CALIDAD
2014011000272	FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN PÚBLICA NACIONAL-	0%	0%	0%	34

El proyecto es nuevo para esta vigencia y su objetivo consiste en definir mecanismo de gestión del conocimiento en torno a prácticas y experiencias de Innovación Social en el ciclo de política pública y lograr implementarla.

Para la vigencia 2015, **el proyecto contaba con recursos de fuente crédito**, sin embargo con fin de centralizar todos los recursos del mismo en un solo proyecto de inversión que facilite el monitoreo y seguimiento a los productos resultantes de la ejecución, se definió la pertinencia de realizar un traslado al proyecto de inversión con código BPIN No.2013011000197 “Fortalecimiento de la Planeación Estratégica Sectorial de Largo Plazo Nacional”, el cual tiene dentro de sus objetivos “Promover, la participación privada en proyectos que faciliten el desarrollo de la infraestructura productiva y social inherente a la finalidad del Estado.”, y asociados a este se encuentran relacionados los productos generados por cada componente del crédito, sobre cual el Departamento Nacional de Planeación - DNP lidera toda la estrategia de Asociaciones Público Privadas para el Desarrollo de Infraestructura.

En el marco de dicho proyecto se adelanta la contratación de los estudios: (i) APP para Museos, (ii)APP para Bibliotecas, (iii) APP para carreteras y (iv) Indicadores de Sostenibilidad Ambiental, así como estudios de análisis de alternativas de participación privada en proyectos de espacio público (financiación, diseño, construcción, dotación, operación y mantenimiento), entre otros.

Traslado

Teniendo en cuenta el gran volumen de solicitudes que el DNP ha recibido para brindar apoyo en la estructuración de APP sociales y que el proyecto de inversión código BPIN 2014011000272 “Fortalecimiento de la Innovación Social en la Gestión Pública Nacional “, no alinea sus objetivos y productos con el alcance, componentes y objetivos del crédito BID No. 3090-OC-CO, se hace necesario efectuar el traslado de dichos recursos para atender la demanda de los sectores al DNP en la estructuración de APP que promuevan el desarrollo de la infraestructura.

Por otro lado, informamos que actualmente Departamento Nacional de Planeación - DNP a través de sus proyectos de inversión financia el diseño y estructuración de la “Política Nacional de Innovación Social” atendiendo a las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018, en las que se hace hincapié en la modernización de la administración pública siendo un proceso de optimización de las prioridades estratégicas del Estado, con criterios de austeridad fiscal y de focalización en las reformas de interés prioritario y en los ciudadanos. Bajo esta línea, se continúa trabajando en la consolidación de una arquitectura institucional moderna, adecuada gradualmente a estándares internacionales con una oferta innovadora de servicios mayor y mejor cobertura al ciudadano y que opere bajo criterios de calidad, razón por la cual los productos y metas incluidos en el proyecto de innovación se están cumpliendo.

Es por esto que una vez sea diseñada en el cronograma previsto de la Política de Innovación Social durante este año a través del proyecto sectorial, al proyecto de inversión código BPIN

2014011000272 “Fortalecimiento de la Innovación Social en la Gestión Pública Nacional se le programaron los recursos necesarios para la implementación y ejecución de dicha política, que se espera se inicie a partir de la vigencia 2016.

14. Fortalecimiento de la Gestión Institucional del Departamento Nacional de Planeación en la Ciudad de Bogotá D.C. /2011011000315

Código BPIN	Nombre Proyecto	EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	EJECUCION FISICA (%)	EJECUCIÓN EN GESTION (%)	INDICE TOTAL CALIDAD
2011011000315	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C	0%	0%	0%	39

Este proyecto contaba con recursos por valor de 258 millones, que con base en el Decreto de aplazamiento le quedaron disponibles un valor de \$ 229.577.786

El Departamento Nacional de Planeación, en su rol como la entidad líder en la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, en la generación y difusión de ideas y conocimiento, y en la administración de la inversión pública nacional, tiene el compromiso y la obligación de adaptarse a las realidades cambiantes del país y de la economía mundial para de esta manera adelantarse a los retos del futuro y atender de manera oportuna los temas prioritarios que tiene a su cargo y debe liderar el Departamento.

Teniendo en cuenta que los objetivos y los fines previstos en los Sistemas de Control Interno, Desarrollo Administrativo y Gestión de la Calidad, son complementarios y con enfoque en una mayor satisfacción del ciudadano, el fortalecimiento del desempeño institucional y el mejoramiento permanente de la gestión pública, se considera necesaria la articulación y armonización de los mismos, a través de la implementación del **Sistema Integrado de Gestión Institucional**.

En ese orden de ideas, este proyecto tiene como propósito mantener e implementar los sistemas los cuales suplirán la necesidad que tiene la entidad de mejorar el desempeño y la capacidad de proporcionar productos y/o servicios que respondan a las necesidades y expectativas de sus clientes.

Adicionalmente y teniendo en cuenta tendencias globales que apuntan hacia la transformación de los entornos laborales, se considerara la modalidad de Teletrabajo como una opción en la entidad que combine las políticas corporativas basadas en el cumplimiento de objetivos junto a los recursos tecnológicos necesarios para alcanzarlos; buscando aportar a los procesos de innovación organizacional, aumento de la productividad, calidad de vida de los trabajadores, protección del medio ambiente, mejoramiento de la movilidad en las ciudades y la generación de procesos de calidad frente a los compromisos con el mercado internacional de bienes y servicios.

La Entidad considera necesario continuar con la implementación del SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, en lo relacionado con los sistemas de Gestión Ambiental- ISO 14001 Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001, el estudio e implementación de la modalidad del teletrabajo, y la implementación de una Escuela Virtual para la divulgación de los sistemas de gestión y temas requeridos de la entidad.

Como los objetivos generales y específicos del proyecto no alcanzaban a abarcar parte de lo anteriormente previsto, el Grupo de Planeación y su Área Técnica la Dirección de Inversiones y Finanzas Publicas decidieron formular un nuevo proyecto y trasladar los recursos de este al nuevo.

Traslado

Con base en lo anterior solo se deja en este proyecto la actividad relacionada con documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (documentación del sistema de seguridad social), con una asignación de \$ 139.000.000, y se traslada al proyecto nuevo \$ 90.577.786.

A la fecha está actividad se encuentra en etapa precontractual.

A continuación se define el nuevo proyecto denominado

15. Fortalecimiento de la Gestión Institucional del Departamento Nacional de Planeación en la Ciudad de Bogotá D.C. /2015011000254

Código BPIN	Nombre Proyecto	EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	EJECUCION FISICA (%)	EJECUCIÓN EN GESTION (%)	INDICE TOTAL CALIDAD
2015011000254	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN NACIONAL	0%	0%	0%	39

Este proyecto tiene como propósito mantener e implementar los sistemas de gestión en todas sus temáticas, los cuales suplirán la necesidad que tiene la entidad de mejorar el desempeño y la capacidad de proporcionar productos y/o servicios que respondan a las necesidades y expectativas de sus clientes actualmente.

Se implementarán procesos orientados a resultados que optimicen todos los recursos con que cuenta la entidad, dotando las dependencias de herramientas e instrumentos que les permita autoevaluar y auto-controlar su gestión. De igual manera, se capacitarán y sensibilizarán a los funcionarios para mantener la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión- Escuela de formación Virtual.

Adicionalmente y teniendo en cuenta tendencias globales que apuntan hacia la transformación de los entornos laborales, se considerara la modalidad de Teletrabajo como una opción en la entidad que combine las políticas corporativas basadas en el cumplimiento de objetivos junto a los recursos tecnológicos necesarios para alcanzarlos; buscando aportar a los procesos de innovación organizacional, aumento de la productividad, calidad de vida de los trabajadores, protección del medio ambiente, mejoramiento de la movilidad en las ciudades y la generación de procesos de calidad frente a los compromisos con el mercado internacional de bienes y servicios.

El horizonte del proyecto inicia en la Vigencias 2015-2018, teniendo en cuenta que la Entidad debe continuar con la implementación del SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, en lo relacionado con los sistemas de Gestión Ambiental- ISO 14001 - Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001, así como también resultado y la aplicación del Decreto 1443 de 2014, que establece treinta meses a partir de su publicación para la implementación del Sistema de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Adicionalmente se debe continuar con lo establecido en el Convenio Interadministrativo 012-F de 1986, en donde se crea el Fondo DNP-FONADE-ICETEX con el propósito de generar capacidades a la administración pública en áreas estratégicas para el logro de los objetivos de planeación y desarrollo del país como parte integral de la política de promoción, fortalecimiento y desarrollo de

su recurso humano, a través del otorgamiento de créditos condonables para cursar estudios de posgrado en el exterior.

Desde su creación hasta la fecha se ha otorgado financiación a 258 funcionarios del Departamento Nacional de Planeación y de Fonade. Este proyecto debe continuar con este objetivo específico. Por tal motivo, de conformidad con la decisión adoptada en la última sesión del Comité, se hace necesario inyectar recursos al Fondo DNP-FONADE ICETEX y de esta manera poder seguir financiando estudios de posgrado en el exterior, que contribuyen de manera significativa en la generación de capacidades al interior de la administración pública, por cuanto tal inversión se retribuye en el trabajo que deben prestar los beneficiarios al volver al país en entidades del sector público o como profesores investigadores en universidades para obtener las condonaciones establecidas en Reglamento”.

Traslado

Este proyecto contara con recursos del proyecto anterior del por valor de **\$90.575.786** y con recursos de un trámite de traslado del proyecto de la Dirección de Desarrollo Social por valor de **\$600.000.000** El total de recursos que tendrá el proyecto con este trámite asciende a **\$690.577.786**. Como se puede observar a la fecha, no ha iniciado ejecución por estar pendiente la aprobación por parte del MHCP de los recursos.
